

## **SUPLAN publica o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 5º Bimestre**

A SUPLAN publicou no DODF de quarta-feira, 29 de novembro de 2023, a Portaria nº 775, de 28 de novembro de 2023, que dá publicidade ao Relatório de Desempenho Físico-Financeiro – SAG/2023 – 5º Bimestre.

Tal Relatório, consolidado até o 5º bimestre, contém informações sobre as ações de governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2020-2023 e na Lei Orçamentária Anual – LOA/2023 efetivamente executadas nos meses de janeiro a agosto do exercício corrente.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 5º bimestre de 2023, contendo as informações na íntegra, está disponível no [link](#).

A seguir são apresentadas informações gerenciais e realizações em destaque no 5º Bimestre de 2023.

### **SAG 2023 – 5º Bimestre - Informações gerenciais**

#### **Esclarecimentos iniciais**


Conforme estabelecido nas [instruções](#) de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, a partir do 2º bimestre, é obrigatório o cadastramento de todos os programas de trabalho contidos na Lei Orçamentária Anual (institucionais), independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, exceto se já cadastradas no 1º bimestre.

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.


#### **Informações gerenciais**

Segundo dados obtidos em planilhas geradas pelo SAG WEB, a maior parte das etapas previstas encerrou o 5º bimestre no estágio “Andamento Normal” (70,03 %).

Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “Não iniciada” (15,05%), consistindo no conjunto das etapas cuja não foram executados andamentos previstos na data protetada para início de execução da etapa.

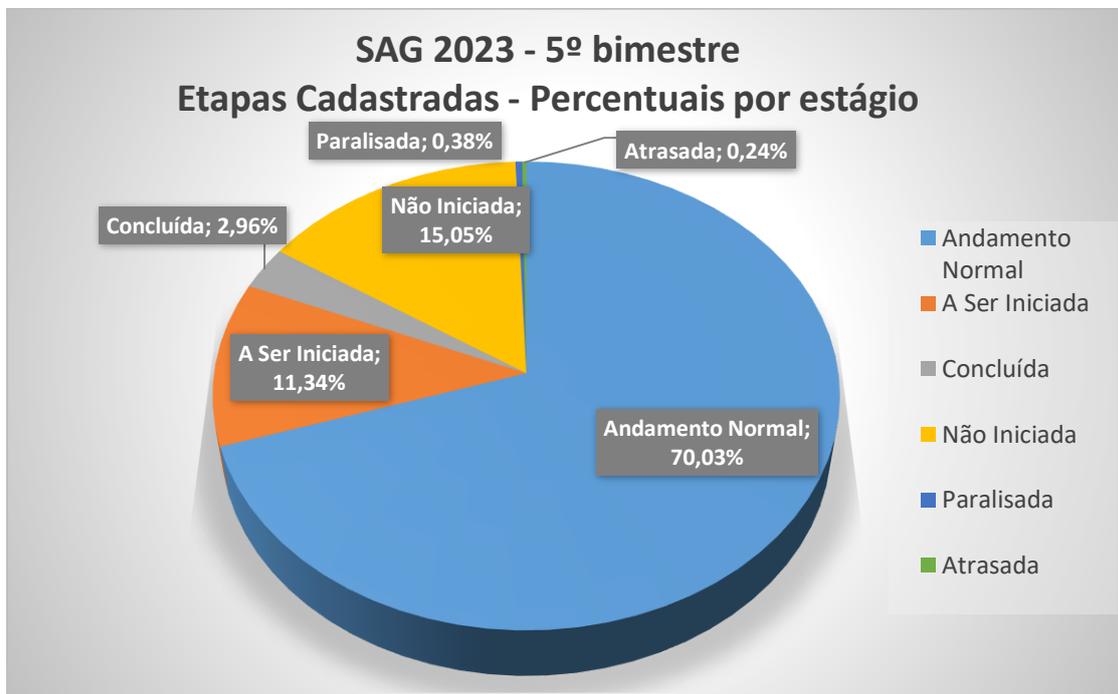


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

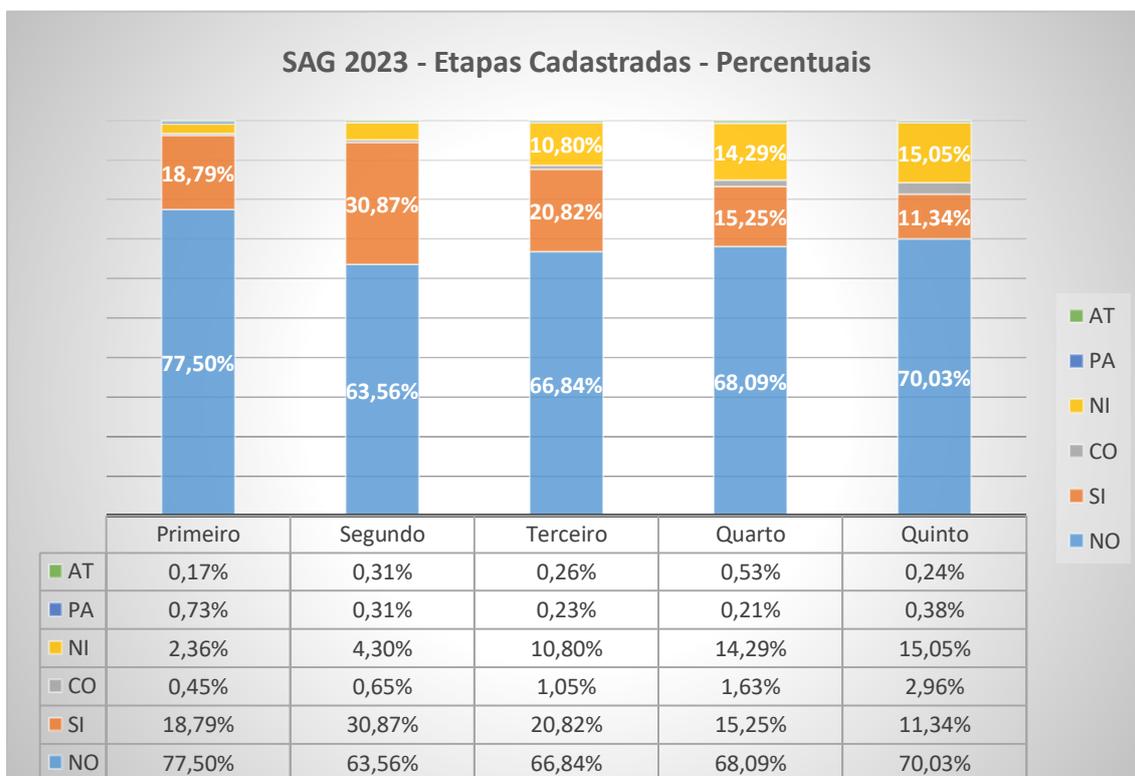


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

A descontinuidade na execução de dada etapa cadastrada – caracterizada pela alteração do fluxo dos estágios de execução “(1) A ser iniciada/ (2) Normal/ (3) Concluída” – enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, origem e detalhamento.

Estão inclusas nesse grupo as etapas nos estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não iniciada” e “Anulada”, as quais se encontram reunidas e apresentadas sob o rótulo “Etapas em desvio” (15,67%), juntamente com as “Etapas regulares” (84,33%), no gráfico abaixo.

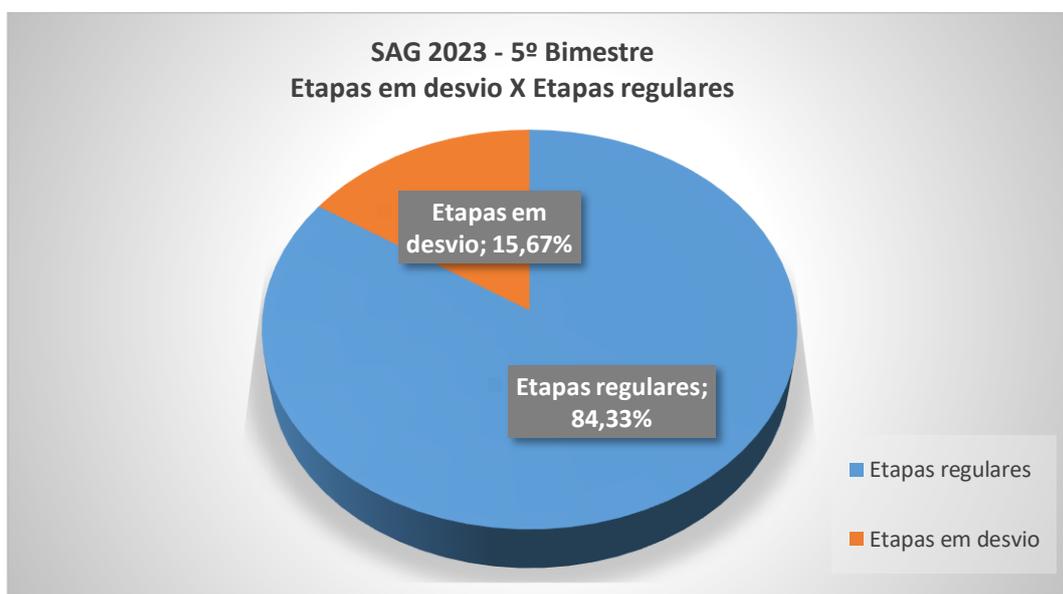


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

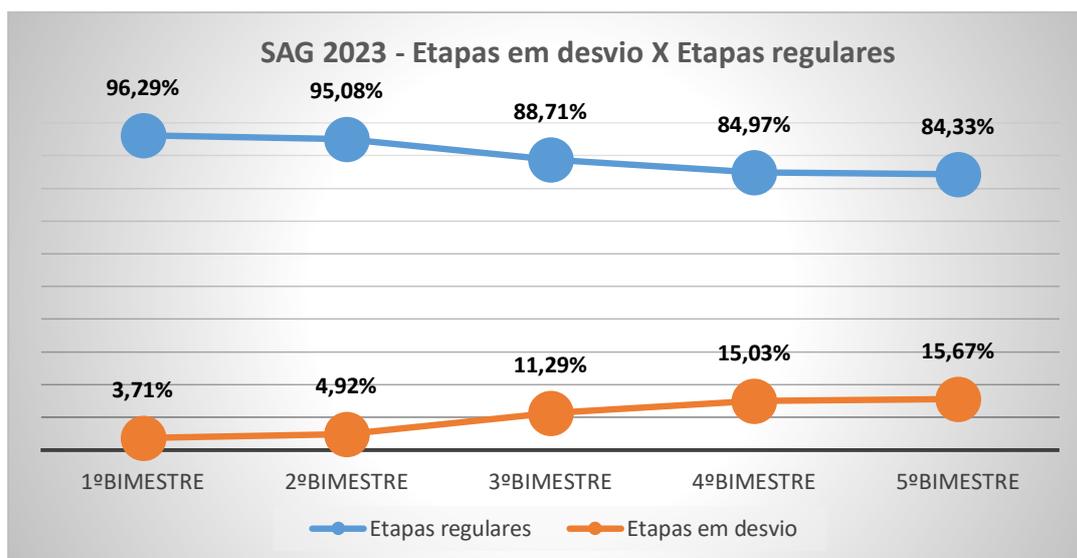


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

Conforme evidenciado no gráfico abaixo, que apresenta os percentuais de desvios segmentados pelas respectivas causas, as ocorrências permanecem concentradas na causa “OCD – Outras causas de desvio” (50,22%), que passou a ser seguida pelas causas “Alteração na programação da unidade executiva “ (12,39%); “ICO – Insuficiência de créditos orçamentários” (11,52%); e, “CCB – Crédito contingenciado ou bloqueado” (7,39%).

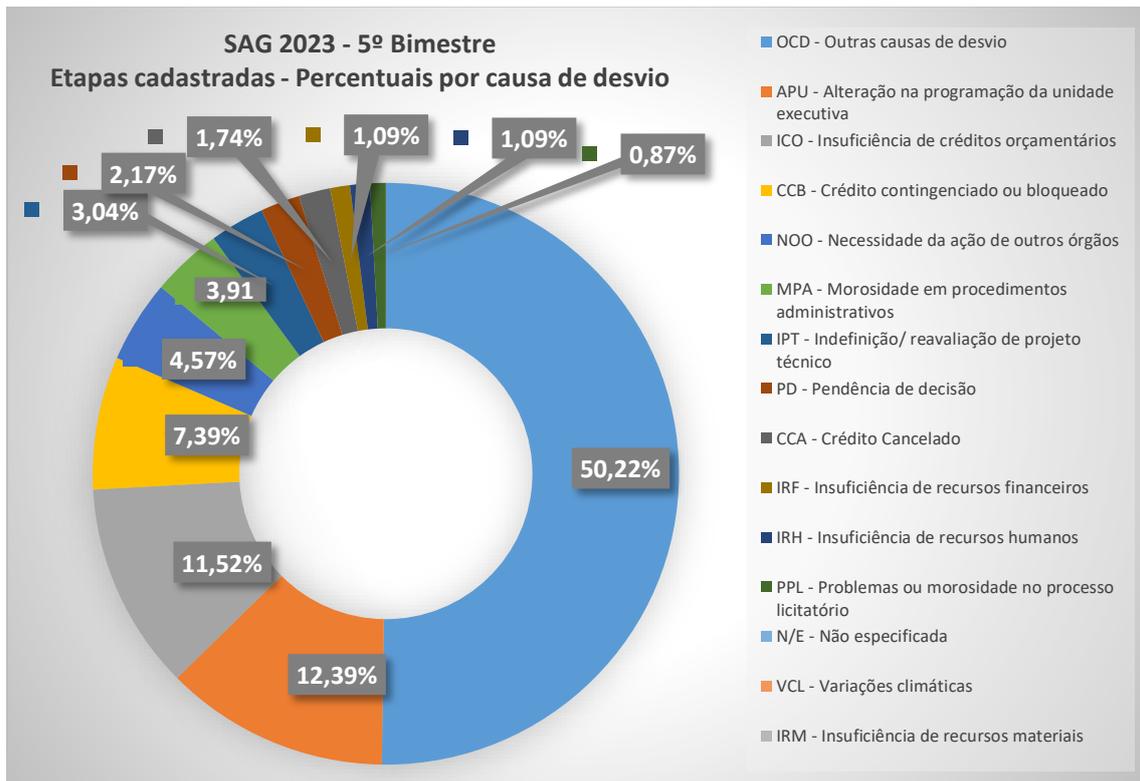


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

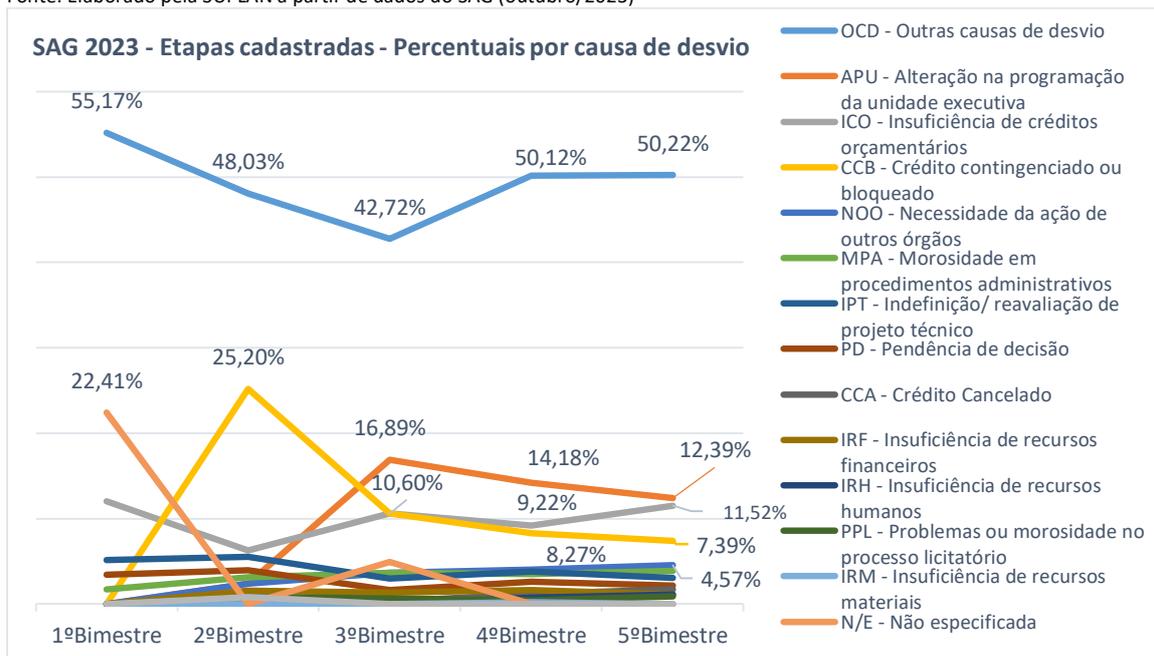


Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

Em relação à natureza dos desvios, objeto do gráfico abaixo, observa-se que as categorias “Administrativa” (61,96%) e “Financeira” (12,17%) representam a maior parte das ocorrências de desvios.

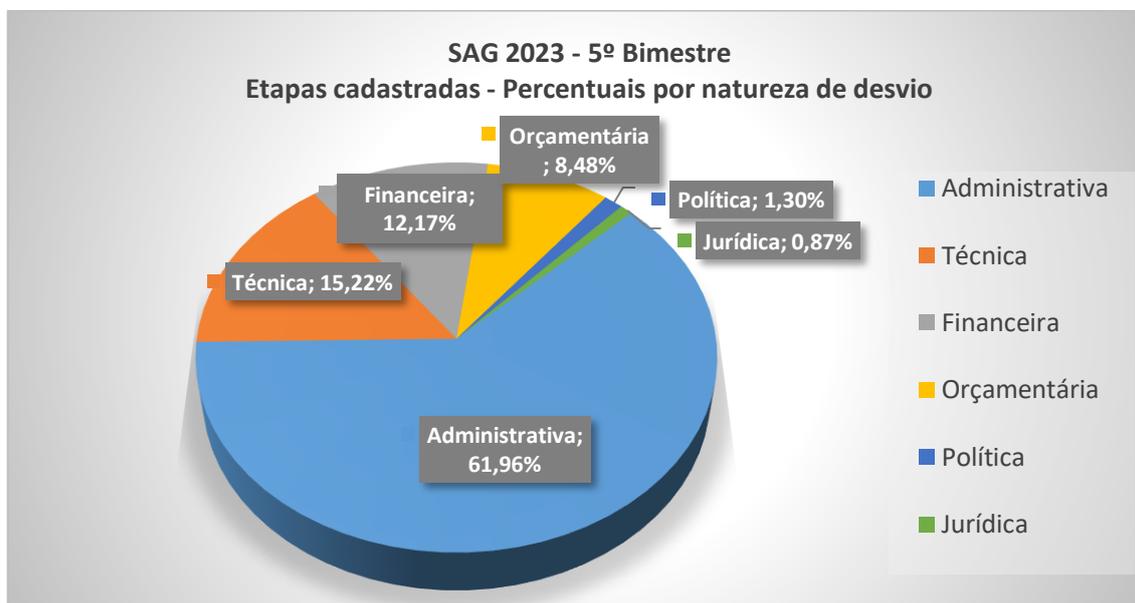

Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

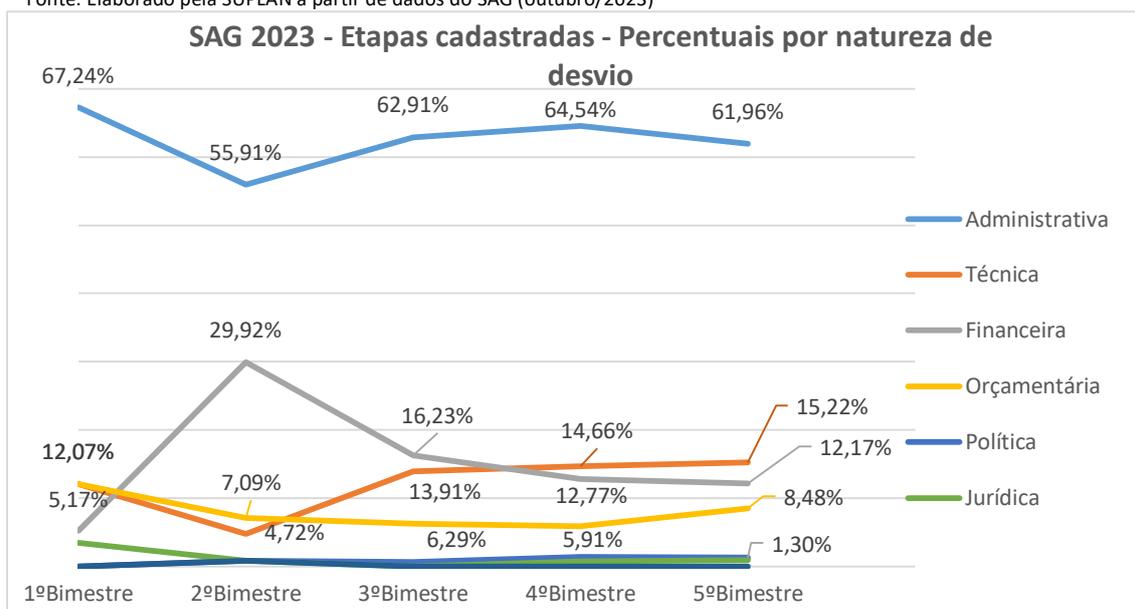

Fonte: Elaborado pela SUPLAN a partir de dados do SAG (outubro/2023)

O conhecimento de resultados acumulados ao longo do exercício e consolidados no documento final – a exemplo do grande volume de etapas não iniciadas e desvios de natureza administrativa e financeira citados, os quais são notadamente ocorrências adversas recorrentes e/ou impactantes no processo execução do planejamento – viabilizam, após análise técnica sistemática realizada à luz do cenário político, econômico e social, a formulação e adoção de medidas capazes de mitigar causas e efeitos indesejáveis, bem como a realização de eventuais ajustes de rota.

## Realizações em destaque no 5º Bimestre de 2023

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, 5º Bimestre de 2023, um espelho da Lei Orçamentária Anual para 2023, destacam-se:

<b><u>15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM.....</u></b>	<b>8</b>
Campanha Publicitária Conselheiros Tutelares 2023.....	8
<b><u>16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC .....</u></b>	<b>9</b>
34º Aniversário de Samambaia.....	9
Coma – Consciência, Música e Arte – Festival Coma#6 .....	9
FearteGama - Feira de Artesanato e Cultura do Gama .....	9
<b><u>20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP.....</u></b>	<b>10</b>
Implantação de infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica no Lago Sul .....	10
Execução de obras de pavimentação e drenagem no Recanto das Emas.....	10
Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte .....	11
<b><u>22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF .....</u></b>	<b>12</b>
Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo pavimentação asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner - Contrato nº 019/2021.....	12
Construção de dois viadutos e alças de acesso na interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 020/2021. ....	13
Execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário urbano - Contrato nº 020/2022.....	14
<b><u>23.901 – Fundação de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES .....</u></b>	<b>16</b>
Hospital de Samambaia amplia média mensal de cirurgias eletivas em 2023 .....	16
Secretaria de Saúde contrata rede complementar para a realização de mais de 400 cirurgias de tireoide .....	16
Reformas no Pronto-socorro e centro cirúrgico do Hran.....	17
Reformas no Unidade de urgência oftalmológica no HRT .....	18
Reformas no Hospital do Gama.....	19
<b><u>26.101 – Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB .....</u></b>	<b>20</b>
Terminal Gama centro .....	20
Terminal Itapoã.....	21
Terminal Varjão.....	22
<b><u>26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER.....</u></b>	<b>24</b>

Construção de ponte na vc-201 sobre o ribeirão contagem .....	24
<b><u>28.209 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB .....</u></b>	<b><u>25</u></b>
Projeto TTS – Trabalho Técnico Social da CODHAB .....	25
<b><u>40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF .....</u></b>	<b><u>28</u></b>
31ª Expoabra .....	28
5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI .....	28
Brasília E-Games Experience.....	29
<b><u>57.101 - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF .....</u></b>	<b><u>30</u></b>
Projeto “MULHER, Não se Cale” .....	30
Espaço Acolher de Sobradinho inaugurado na terça-feira 24/10/2023 .....	30
Espaço Acolher.....	31
Exposição fotográfica celebra mulheres que enfrentaram o câncer de mama 02/10/2023 ..	31
Construção de mais três novas unidades da Casa da Mulher Brasileira (CMB) .....	32

**15.101 – Secretaria de Estado de Comunicação do Distrito Federal - SECOM**

**Campanha Publicitária Conselheiros Tutelares 2023**

Foi realizada no período a Campanha Publicitária Conselheiros Tutelares 2023, que visa informar a população sobre o papel dos Conselheiros Tutelares, bem como, divulgar as eleições de 2023 para os cargos, que ocorreu em outubro 2023.

[www.sejus.df.gov.br](http://www.sejus.df.gov.br)

Quando o Conselho Tutelar atua, o melhor acontece. CDCA/DF

**QUANDO EU VOTO PARA CONSELHEIRO TUTELAR, PROTEJO OS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES.**

**VOTE NO DIA 1º DE OUTUBRO**

Secretaria de Justiça e Cidadania | Secretaria de Comunicação | **GDF**

Quando o Conselho Tutelar atua, o melhor acontece. CDCA/DF

**Quando eu voto para Conselheiro Tutelar, protejo os direitos das crianças e adolescentes.**

**VOTE NO DIA 1º DE OUTUBRO**

Secretaria de Justiça e Cidadania | Secretaria de Comunicação | **GDF**

## **16.101 – Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal - SECEC**

### **34º Aniversário de Samambaia**

O Projeto ofereceu atrações artísticas teatrais, shows com bandas nacionais, locais e regionais, espaço para gastronomia e foi realizado em frente à Administração Regional de Samambaia no período de 19 a 25/10/2023. Beneficiou várias cadeias da cultura e da economia criativa do Distrito Federal. Público estimado de 6.000 pessoas. Foram previstas ações de acessibilidade com disponibilização de rampas, estacionamentos exclusivos e intérprete de libras.

### **Coma – Consciência, Música e Arte – Festival Coma#6**

O Projeto tem em seu alicerce a acessibilidade e a sustentabilidade, é um espaço fundamental no Distrito Federal para refletir, pensar e propor novos caminhos para o futuro do mercado musical do país, a inserção de novos artistas juntamente com profissionais de maior trajetória gera a troca entre a produção realizada no Brasil, fomentando o mercado, promovendo intercâmbio local, regional, nacional e internacional. O projeto incentiva a presença de pessoas com deficiência por meio da entrada gratuita para pessoa com deficiência e um acompanhante, disponibilizou intérprete de libras no centro de convivência, guias para cegos e cadeirantes, cardápios em braile, programação em áudio, em braille, em tinta, banheiros exclusivos, piso acessível (pistas e rampas para cadeirantes, pessoas com deficiência e carrinhos de bebês), local elevado em frente aos palcos principais.

### **FearteGama - Feira de Artesanato e Cultura do Gama**

O Projeto tem como objetivo atrair novos mercados e investidores, potencializar o artesanato brasiliense como uma importante fonte de renda e geração de emprego, com a disponibilização de espaços para a comercialização dos produtos. Na feira tivemos o Salão Gastronômico que valorizou a culinária da região do Gama e recebeu artistas, como forma de entreter e divertir os visitantes. Para facilitar a mobilidade, foram dispostas rampas, sinalização, espaços adaptados para circulação de cadeiras de rodas e banheiros adaptados e contratação de Intérprete de Libras. Público estimado de 3.000 pessoas.

## 20.201 - Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP

### Implantação de infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica no Lago Sul

Trata-se da implantação de infraestrutura de drenagem urbana e pavimentação asfáltica, meios-fios, sinalização, calçadas e demais elementos conforme projetos apresentados, nos Lotes 01 e 02, QI 28, Centro Comercial Lago Sul.



### Execução de obras de pavimentação e drenagem no Recanto das Emas

Tem por objeto a Execução de obras de pavimentação e drenagem nas Quadras 7 e 8 do Residencial Tamandú – Recanto das Emas.



### **Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar na Asa Norte**

Obras de engenharia para implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias do sistema existente e ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos ramais de ligação e bacia de retenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte, conforme projetos em anexo. As obras serão executadas na Asa Norte, Plano Piloto do Distrito Federal.



## 22.101 – Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal - SODF

**Obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, incluindo pavimentação asfáltica, rotatórias, drenagem urbana, meios-fios, calçadas, sinalização horizontal e vertical e implantação de uma galeria subterrânea, em Tunnel Liner - Contrato nº 019/2021.**

A intervenção consiste da execução de remanescentes obras de Infraestrutura Urbana no Setor Habitacional Vicente Pires, que, quando concluídas, irão garantir à população infraestrutura adequada, evitando inundações e alagamentos.

No bimestre foram executados 3,10% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 93,00%.

- Principais serviços executados no 5º bimestre:

- Pavimento Asfáltico: 3.800m<sup>2</sup>;
- Passeios: 600m<sup>2</sup>;
- Meios-fios: 1.800m;
- Rede de drenagem pluvial: 2.450m;
- Sinalização: 1.650m<sup>2</sup>.



Imprimação da chácara 177, rua 10.



Terraplenagem da chácara 101, rua 05.



Execução de pavimento asfáltico da chácara 94, rua 03.



Execução da base de brita graduada da chácara 94, rua 03.

**Construção de dois viadutos e alças de acesso na interseção da rodovia DF-011 (EPIG) com a via de acesso ao Parque da Cidade e o Setor Sudoeste - Contrato nº 020/2021.**

A intervenção integra a futura operação do sistema de transportes coletivos de massa, Corredor Eixo Oeste, proposto pelo Plano Diretor de Transportes Urbanos e Mobilidade do Distrito Federal – PDTU/DF, regido pela Lei nº 4.566, de 04 de maio de 2011. Em ritmo acelerado, visa proporcionar maior fluidez do trânsito da região.

No bimestre foram executados 13,00% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 98,00%.

- Principais serviços executados no 5º bimestre:

- Pavimento Asfáltico: 16.679m<sup>2</sup>;
- Meios-fios: 1.582m
- Grama: 33.063m<sup>2</sup>



Execução de ciclovia, trecho 01.



Execução de ciclovia, trecho 01.



Lançamento das vigas longarinas, OAE 03.



Lançamento das vigas longarinas, OAE 03.

**Execução dos serviços de Requalificação Urbana do Setor Comercial Sul, Quadra 05, Asa Sul, Brasília-DF, Região Administrativa do Plano Piloto - RA-PP, compreendendo a recuperação do pavimento existente, sinalização viária, paisagismo, execução de calçadas, escadas e rampas, recuperação estrutural de passarela (viaduto) e implantação de mobiliário urbano - Contrato nº 020/2022.**

A proposta desenvolvida para a quadra visa a criação de novas possibilidades de utilização dos espaços públicos. A acessibilidade é o foco da intervenção planejada para a quadra, que irá complementar os projetos do Caminho Fácil e do Caminho Central, implantados em 2012 no Setor Comercial Sul.

No bimestre foram executados 18,96% dos serviços contratados, perfazendo o total acumulado de 75,66%.

- Principais serviços executados no 5º bimestre:

- Meios-fios: 46m
- Cordão de concreto: 138m
- Assentamento de piso tipo "fulget" (40x40x3): 48m<sup>2</sup>
- Recuperação de pavimento asfáltico: 6.391m<sup>2</sup>



Execução de escada em concreto/assentamento de cordão de concreto.



Execução de escadas e rampas em concreto.



Recuperação de pavimento asfáltico entre as quadras 04 e 05.



Assentamento de piso tipo "fulget"(40x40x3).

## **23.901 – Fundação de Saúde do DF/ Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – FS/SES**

### **Hospital de Samambaia amplia média mensal de cirurgias eletivas em 2023**

Centro de referência para realização de cirurgias eletivas da Secretaria de Saúde (SES-DF), o Hospital Regional de Samambaia (HRSam) ampliou a média mensal de procedimentos realizados em 2023. Até o fim de julho, a unidade somou 2.531 cirurgias eletivas, uma média de 361 ao mês. No ano passado, foram cerca de 322 a cada mês. A Unidade é referência em retirada de vesícula e correção de hérnias.

Em 2023, o HRSam também foi beneficiado com a aquisição de um novo foco cirúrgico, ativado no centro obstétrico, e de "carrinhos de anestesia", como são chamados os equipamentos necessários para a realização das cirurgias.

Além das cirurgias eletivas, o HRSam também recebe pacientes transferidos para seus leitos de UTI e mantém um centro obstétrico com cerca de 300 partos por mês.



### **Secretaria de Saúde contrata rede complementar para a realização de mais de 400 cirurgias de tireoide**

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) firmou contrato com o Hospital São Mateus, da rede complementar, para reduzir a lista de espera com a realização de 424 cirurgias de tireoidectomia total, extirpação de bócio intratorácico e tireoidectomia parcial. O contrato possui vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado, prevê ainda consultas pré-operatórias e pós-operatórias, pré-anestésica e internação, se necessário. O convênio possui investimento de mais de R\$ 2,7 milhões.

Ainda neste ano, a SES-DF também lançou outros editais voltados para cirurgias nas áreas de oftalmologia, coloproctologia, otorrinolaringologia, urologia e varizes. No total, serão realizadas mais de 7 mil procedimentos ao longo de 2023 e 2024.

O hospital contratado precisa manter exigências de qualificação econômico-financeira e fiscal, além de atender critérios como estrutura de atendimento e parecer conforme as normas da Vigilância Sanitária.



Para cada caso, haverá a indicação do melhor tratamento, podendo ser por meio de medicamentos ou da remoção da tireoide.



### **Reformas no Pronto-socorro e centro cirúrgico do Hran**

Com o objetivo de aprimorar o fluxo de atendimento dos pacientes e trazer maior qualidade e bem-estar, o centro cirúrgico e o pronto-socorro do Hospital Regional da Asa Norte (Hran) passam por revitalizações. As adequações incluem piso, parede e teto, além de novos mobiliários assistenciais e equipamentos.

No centro cirúrgico, as oito salas foram revitalizadas, assim como as de recuperação anestésica. Além disso, foram instaladas iluminações blindadas e as paredes passaram por pinturas integrais, com tinta lavável. Houve ainda troca de bate-

macas e o piso foi revitalizado nos principais pontos. Em adição novos focos de teto cirúrgicos, mesas cirúrgicas e instrumentos foram adquiridos.

Já no pronto-socorro, as adequações foram divididas em cinco etapas. Neste momento, a revitalização está em sua terceira fase, focada na sala de observação. As mudanças no setor preveem melhorias do piso, do sistema integral de climatização, novas pinturas e aquisição de mobiliário assistencial e de diversos equipamentos.




#### **Reformas no Unidade de urgência oftalmológica no HRT**

O setor de urgência oftalmológica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) está de cara nova. O espaço foi ampliado e revitalizado, dando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores. O serviço está disponível 24 horas, diariamente, com pacientes encaminhados a partir do setor de emergência.

O serviço de revitalização do setor envolveu melhorias no piso, nas paredes e nos tetos, além de mudanças nos móveis e no sistema de iluminação. Também houve a instalação de uma terceira estação de atendimento, que será utilizada nos momentos de maior fluxo de pacientes, e de uma sala para procedimentos como retirada de pontos.

As adequações no HRT são possíveis devido a contratos de manutenção regular assinados pela Secretaria de Saúde (SES-DF) em 2022. Ao todo, a pasta fez um investimento de R\$ 74 milhões para garantir o funcionamento de 297 unidades. As contratações agilizam serviços como ajustes de instalações de água e energia, pinturas, reparos de pisos, troca de janelas, entre outras necessidades.

Atualmente, o HRT também promove adequações no setor de oncologia, do telhado e da rede elétrica, além de ter iniciado melhorias em berços e poltronas do pronto-socorro.

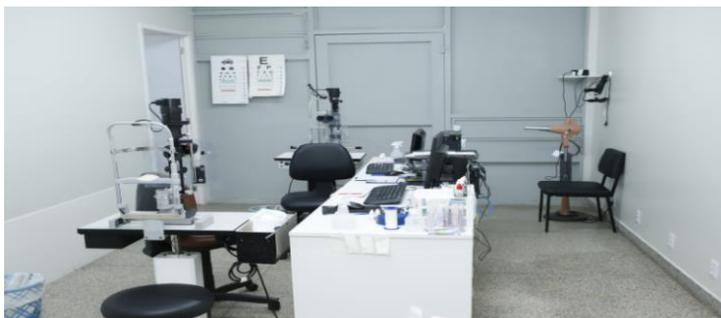

## **Reformas no Hospital do Gama**

Para melhorar o ambiente, o acolhimento e o conforto para os usuários e servidores, o Hospital Regional do Gama (HRG) passa por revitalizações. Os reparos abrangem vários setores, como a maternidade, o corredor central e os prontos-socorros adulto (PSA) e cirúrgico (PSC). As melhorias ocorrem em etapas para não comprometer o atendimento aos usuários.

Entre as melhorias nos prontos-socorros adulto e cirúrgico estão a substituição da iluminação e das louças dos banheiros, pintura de paredes, tetos e cadeiras da recepção, além da impermeabilização do piso e reparos em vidraçaria. Outra novidade é a organização do pronto-socorro com a instalação de cortinas e a separação em alas feminina e masculina, proporcionando mais privacidade durante o atendimento.

O corredor principal da unidade passa por melhorias e ganhará novo piso, nova pintura e iluminação. Na maternidade também está em andamento a troca de pavimentação, que é substituída por um do tipo paviflex, material que apresenta maior durabilidade para áreas de grande fluxo de pessoas.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) tem investido em adequações na estrutura da rede, por meio de contratos de manutenção assinados pela pasta em 2022. No HRG, o centro de radiologia já foi revitalizado e ganhou novos guichês de atendimento e sala de recepção para os usuários.



## **26.101 – Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal - SEMOB**

### **Terminal Gama centro**

O Terminal do Gama Centro teve avanços significativos, alcançando agora a marca de 62% da obra concluída. Este marco reforça o compromisso da equipe envolvida no projeto em acelerar os trabalhos, visando atingir as metas estabelecidas. Valor orçado de R\$ 8.360.881,56, já pagos R\$ 3.966.576,55.

Entre os destaques desse progresso, o piso em granitina atingiu a marca de 87% com acessibilidade, e o reboco dos módulos centrais está próximo da conclusão, alcançando 85%, além da cobertura completa da plataforma 01 e parte central que se iniciará dia 08 de dezembro. Na parte técnica, a porcentagem da instalação elétrica já atingiu 12%, enquanto a hidráulica encontra-se notavelmente avançada, com 90% de conclusão. Destaco que o pavimento de concreto rígido está concluído e em fase de sinalização.

Com a conclusão destas fases, os permissionários serão em breve realocados para a nova plataforma, marcando o início de uma operação mais moderna e eficiente no novo lado do terminal.

Após esta transição, a próxima etapa contemplará a demolição da parte antiga, consolidando o compromisso com a renovação completa do Terminal do Gama Centro. Com a obra agora atingindo 62% de conclusão, a comunidade local pode antever um futuro onde as instalações oferecerão um serviço de transporte público de alta qualidade e uma experiência mais confortável para todos os usuários. O calendário para a inauguração oficial da Plataforma 01 permanece firme, mantendo o objetivo de celebrareste importante marco até o final de 2023.



Concretagem do pavimento rígido (baias)



Execução de Estrutura Metálica da cobertura



Montagem da Estrutura Metálica



Concretagem do pavimento rígido (baias)

## Terminal Itapoã

O Terminal do Itapoã está avançando de maneira significativa, atingindo a marca de 74% de conclusão. Dentre as principais etapas, destaca-se a execução da cobertura para proporcionar conforto e proteção. Orçado em R\$ 4.452.610,4, já pago R\$ 2.489.530,60. O pavimento rígido está em progresso, garantindo estabilidade para a circulação. O gabarito do estacionamento está sendo delineado para otimizar o espaço, enquanto a instalação da rede de águas pluviais contribui para o manejo adequado das chuvas. A preparação do contrapiso da plataforma está em andamento, visando criar uma base sólida. Este progresso demonstra um comprometimento com a qualidade e segurança, antecipando a inauguração do terminal como um ponto crucial de conexão na região.



Estrutura metálica da cobertura



Concretagem pavimento rígido



Cura do pavimento rígido



Cura pavimento rígido

## Terminal Varjão

O Terminal Varjão, atualmente em 83% de conclusão, destaca-se pelos avanços técnicos notáveis. A execução do terraplenagem estabeleceu uma base sólida para o pavimento rígido, atualmente em processo de concretagem. As instalações elétricas, hidráulicas e hidro sanitárias estão sendo implementadas com precisão para garantir operações seguras e eficientes. Orçado em R\$ 1.715.884,89 e pago R\$ 1.462.100,87

A execução dos revestimentos dos módulos, além de contribuir esteticamente, reforça a durabilidade estrutural. A finalização da cobertura, marco técnico crucial, assegura não apenas proteção climática, mas também integridade estrutural a longo prazo. Essas realizações técnicas refletem um compromisso com a excelência, prometendo uma infraestrutura moderna e funcional. A inauguração iminente representa um avanço técnico significativo para o Terminal Varjão.



Terraplanagem do pavimento



Armazenamento das telhas termoacústicas



Revestimento cerâmico dos módulos




Demarcação de baias e finalização da cobertura

## Terminal Sol Nascente

O Terminal Sol Nascente está em estágio avançado, atingindo 94% de conclusão. No entanto, alguns aspectos essenciais aguardam a execução do serviço de remanejamento do poste para a conclusão total. Entre as etapas finais destacam-se o acabamento e polimento da plataforma, o acabamento interno dos módulos, a finalização e reparo das acessibilidades e passeios, além da pavimentação e sinalização do estacionamento particular. A sinalização geral do terminal também está prestes a ser concluída. A inauguração iminente representa um marco significativo para a comunidade local, proporcionando um terminal moderno e eficiente para o transporte público.



Pavimentação do estacionamento particular

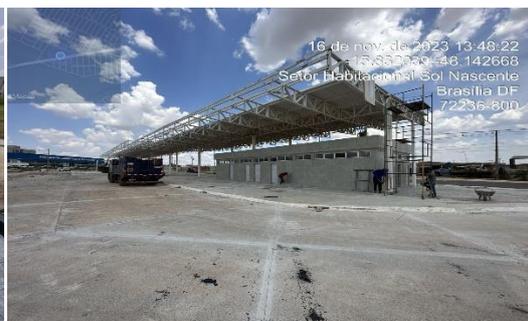

Pavimento rígido e cobertura


## 26.205 – Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER

### Construção de ponte na vc-201 sobre o ribeirão contagem



O DER está fazendo a execução de Obras de Construção de Ponte na VC-201 sobre o Ribeirão Contagem com elaboração de Projeto Executivo de Engenharia. A obra conta com um investimento de mais de R\$ 4,25 milhões. A construção já está quase finalizada, concluído os

serviços preliminares, terraplenagem, e terminando parte de infraestrutura.

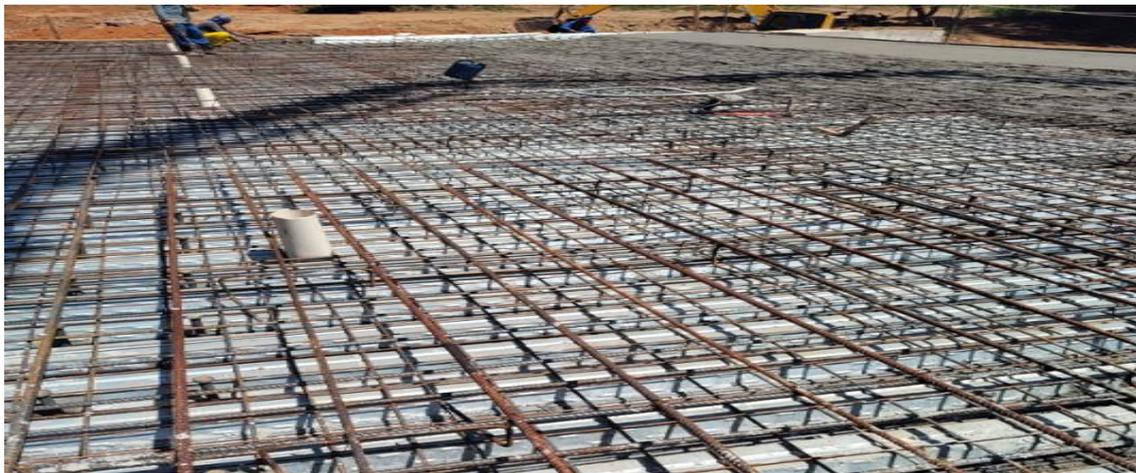

## 28.209 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB

### Projeto TTS – Trabalho Técnico Social da CODHAB

#### - Cursos e Oficinas:

> Curso de extensão de cílios; Oficina de convivência e coletividade; Curso de depilação; Curso de cabeleireiro e Oficina Movimenta-se, realizados no Pôr do Sol - Sol Nascente.

> Oficina de bordados e crochê; Palestra de empreendedorismo e Revisão da horta comunitária, realizados no Crixá V, VI e VII - São Sebastião.



Curso Extensão de Cílios, Sol Nascente



Oficina Convivência e Coletividade, Sol Nascente



Oficina de bordados e crochê, Crixá V



Curso de Depilação, Sol Nascente



Palestra de Empreendedorismo Crixá VII



Curso Cabelereiro, Sol Nascente



Revisão da Horta Comunitária, Crixá VI



Oficina Movimenta-se, Sol Nascente

Destaca-se que o Projeto de Trabalho Social-PTS, continua em plena atividade nos Crixá V, Crixá VI, e Crixá VII, Processo SEI 00392-00005952/2020-51. Encontra-se em execução, das quais trazemos um resumo do realizado no referido período: Oficina de horta comunitária, ação para o dia das crianças, ação sobre empreendedorismo, pesquisas sobre os cursos/oficinas de interesse da comunidade, palestras com os síndicos, educação sobre a separação de resíduos, atendimento de Psicologia, Oficina de bordados e crochê, plantão social com a comunidade e manutenção das hortas comunitárias, atendendo as 816 famílias dos condomínios do Crixás V, VI e VII.

Ressalte-se também que o Projeto de Trabalho Social-PTS, Pôr do Sol na RA Sol Nascente/DF, Trechos I, II e III, executado pelo Programa, PAC - Pró Moradia com contrato na CAIXA nº 0262.225-34/2009, com Ação/Modalidade, Urbanização e Regularização de Assentamentos Precários, Fonte de Recursos advindos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços – FGTS, a realização acontece de forma direta com a Associação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia-ABRADESA, está em plena execução, nos eixos Mobilização, Organização e Fortalecimento Social, Desenvolvimento Socioeconômico, Educação Ambiental e Patrimonial e Gestão Social da Intervenção com oficinas, “Se essa rua fosse minha”, “Convivência e Coletividade”, “Liderança e Empreendedorismo”, “Prevenção de Drogas”, “Movimente-se”, “O lixo no lugar certo”, “Capoeira nas escolas”, cursos de informática e cabelereiro, depilação, extensão de cílios e designer de sobrancelhas, plantões sociais e Jornal Sol Nascente. Atendendo e auxiliando a população em uma expectativa de 500 pessoas.

## 40.201 - Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal – FAPDF

### 31ª Expoabra

A 31ª Expoabra, foi contemplado pelo Edital 02/2023 - Patrocínio, Processo SEI 00193-00001521/2023-22, no valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), para realização do evento “.

O evento foi realizado pelo Parque Granja do Torto - PGT, no PqEAT, na Granja do Torto, em Brasília, no período de 03 a 17 de setembro de 2023. Com entrada gratuita, a Arena Tecnológica da 31ª Expoabra foi palco para troca de conhecimentos inovadores sobre o setor agropecuário no DF.

O evento foi direcionado para os produtores e empresários do agronegócio, entidades públicas e privadas, empresas do segmento rural, formadores de opinião, estudantes e comunidade.



### 5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI

A 5ª Mostra de Tecnologia Brasília Mais TI, foi contemplado pelo Edital 02/2023 - Patrocínio, Processo SEI 00193-00001446/2023-08, no valor de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para realização do evento “.

O evento foi realizado no Setor de Clubes Esportivos Sul, no Lago Sul, em Brasília, entre os dias 25 e 26 de outubro de 2023. Com entrada gratuita, a mostra contou com podcasts, painéis, workshop de recursos humanos, palestra magna e pitches, que são momentos exclusivos para exposição de soluções inovadoras.

O evento discutiu Inteligência Artificial (IA), o processo de modernização tecnológica no governo local e federal, questões de mercado relacionadas às empresas do DF, entre outros assuntos.



### **Brasília E-Games Experience**

O Brasília E-Games Experience, foi contemplado pelo Edital 02/2023 - Patrocínio, Processo SEI 00193-00001573/2023-07, no valor de R\$ 606.380,00 (seiscentos e seis mil e trezentos e oitenta reais), para realização do evento.

O evento foi realizado na Praça das Fontes, no Parque da Cidade, em Brasília, entre os dias 27 e 29 de outubro de 2023. Com entrada gratuita, o evento contou com painéis de discussão, rodadas de bate-papo para troca de experiências, campeonatos e expositores da área de games.

O evento reuniu games, robótica, inovação, tecnologia e pesquisa científica na área digital, com a participação de palestrantes locais e nacionais com conhecimento nas áreas citadas, com destaque para robótica e games.



## 57.101 - Secretaria de Estado da Mulher do Distrito Federal - SMDF

### Projeto “MULHER, Não se Cale”

Trata-se de um projeto de enfrentamento às diversas formas de violência contra as mulheres, com o objetivo de conscientização, orientação e apoio, visa, em especial, ampliar o debate sobre a importância desse tema junto à sociedade do Distrito Federal, alcançando, para tanto, o público em seu dia-a-dia, que circulam nas diversas estações do metrô no Distrito Federal, oferecendo e disponibilizando materiais e canais, tanto de conscientização como estandes de divulgação, conscientização e apoio, bem como divulgação de canais de denúncia, além da identidade visual do projeto, como adesivagem dos trens, cartazes e banners com mensagens e orientações sobre o tema. O projeto aconteceu de forma presencial, nas estações do metrô, e também de forma digital, seja por reportagens, mídias em sites especializados e redes sociais.



### Espaço Acolher de Sobradinho inaugurado na terça-feira 24/10/2023

Equipamento atende a homens e mulheres envolvidos em situações de violência doméstica

A Secretaria da Mulher (SMDF) inaugurou no dia 24/10/2023, em Sobradinho, o novo Espaço Acolher. O equipamento faz parte da rede de proteção às mulheres, que conta com 8 unidades de acompanhamento psicossocial dos envolvidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher no DF. As vítimas e autores de violência podem procurar os locais de forma espontânea ou encaminhadas pelo Poder Judiciário.

## Espaço Acolher

Os Espaços Acolher existem desde 2003, quando foi aberta a primeira unidade do equipamento na sede do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), em Samambaia. Segundo dados da Secretaria, de janeiro a setembro de 2023 foram realizados 6.676 atendimentos.

Os oito locais espalhados pelo DF, antes só recebiam mulheres e homens a partir de encaminhamentos judiciais e da Casa Abrigo, enquadrados na Lei Maria da Penha, envolvidos em situações de violência doméstica e familiar. Agora, qualquer um pode procurar ajuda.



## Exposição fotográfica celebra mulheres que enfrentaram o câncer de mama 02/10/2023

Mostra integra calendário de ações, lançado nesta segunda-feira (2), para o mês de conscientização e prevenção à doença

O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo. Embora seja um tema difícil de tratar, falar abertamente sobre a doença pode ajudar a esclarecer mitos e verdades e, com isso, aumentar o conhecimento e a prevenção. Com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização, a Secretaria da Mulher (SMDF) lançou, nesta segunda-feira (2), o [calendário de ações para o mês de outubro](#). A ação ocorreu no Espaço Qualidade de Vida, do Anexo do Palácio do Buriti, com a exposição fotográfica *outubro Rosa 10 anos*, em parceria com o Instituto Recomeçar.

Durante todo o mês de outubro foram realizadas diversas atividades como distribuição de materiais, palestras, atendimentos para promover saúde da mulher, manifestações artísticas e rodas de conversa.



## Construção de mais três novas unidades da Casa da Mulher Brasileira (CMB)

O Governo do Distrito Federal (GDF) autorizou a construção de mais três novas unidades da Casa da Mulher Brasileira (CMB). As sedes serão em Sobradinho II, São Sebastião e Recanto das Emas, já com ordem de serviço assinada pelo governador do Distrito Federal. Uma quarta unidade está em fase final de licitação no Sol Nascente/Pôr do Sol. O investimento total é de R\$ 8,8 milhões, proveniente de emendas federais e do próprio GDF.

Cada uma com 270 m<sup>2</sup> de área construída, as três novas unidades estarão preparadas para atender mulheres em situação de vulnerabilidade e terão recepção, depósito, copa, banheiros e salas de coordenação técnica, de atendimento individual, multifuncional, atendimento em grupo e convivência, além de brinquedoteca e fraldário.



Obra CMB Recanto das Emas em execução das paredes e enchimento de pilares. 20 % concluída.



Obra CMB Sobradinho II em execução de paredes e pilares. 20% concluída



Obra CMB São Sebastião em início de execução das paredes. 13% concluída

## SAG 2023 – 6º Bimestre

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental – abrirá para as Unidades Orçamentárias no dia 11 de dezembro de 2023, permanecendo disponível para a realização de atualizações relativas ao 6º bimestre até o dia 10 de janeiro de 2024, ocasião em que será fechado em razão do início do processo de análise e *feedback* pela equipe técnica da SUPLAN.

No site da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração ([www.seplad.df.gov.br](http://www.seplad.df.gov.br)) permanecem à disposição das Unidades Orçamentárias (UOs) conteúdos desenvolvidos para dar suporte operacional e técnico para a prestação de informações no SIGGO/SAG WEB, sem prejuízo do apoio técnico individual prestado diretamente pela SUPLAN por e-mail, chamadas de voz, mensagens de texto e atendimentos presenciais previamente agendados.

Tais conteúdos, atualizados e disponibilizados em dois formatos – manual de instruções (texto) e apresentação (slides), podem ser acessados no [link](#).
