


PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

1º BIMESTRE - 2025

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO GOVERNAMENTAL - SAG



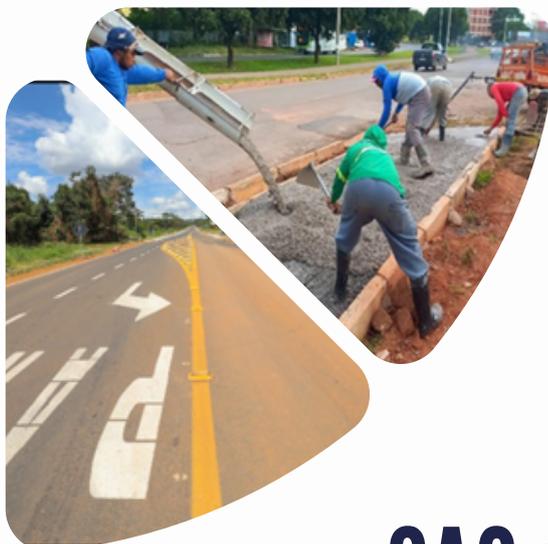

Governo do Distrito Federal

GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL
Ibaneis Rocha

VICE-GOVERNADORA DO DISTRITO FEDERAL
Celina Leão

SECRETÁRIO DE ESTADO DE ECONOMIA
Ney Ferraz Júnior

SECRETÁRIO EXECUTIVO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO
Thiago Rogério Conde

SUBSECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
Luiza Almeida Londe



Publicação elaborada pela

SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

SUBSECRETÁRIA

Luiza Almeida Londe

EQUIPE TÉCNICA

Adriane Freitas de Oliveira Cotias e Silva

Alexandre Bartolomeu Côrtes Rosa

Andrea Nunes Lazzarini

Camila Cristina Ferreira

Danilo Costa Macêdo

Donaldo César Rodrigues

E'len de Oliveira

Erinaldo da Silva Lêla

Eudóxia Maria Machado da Silva Andrade

Fabício Santos de Sousa

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes

Hayk Carvalho Silva

João Carvalho Leal

Joseilda Mendes de Mello

Kaique dos Santos Mendes

Letícia Oni Pimenta Laurentino

Luiz Carlos de Oliveira

Marco Aurélio Teixeira

Maria Auxiliadora Fernandes

Maria Raquel de Almeida Zeferino

Maria Vitória Nava Silva do Carmo

Pedro Augusto César

Rafael Duarte de Paula Silva

Raianne Paiva Nogueira Lamounier

Sharlene Goncalves de Araujo

Wallefer Riches Marques da Costa

**SUPERVISÃO DAS PRINCIPAIS
REALIZAÇÕES**

Danilo Costa Macêdo

**PESQUISA E ORGANIZAÇÃO DO
CONTEÚDO**

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes

Hayk Carvalho Silva

REVISÃO DO CONTEÚDO

Gabriel Carlos Ribeiro Antunes

Hayk Carvalho Silva

Danilo Costa Macêdo

**PROJETO GRÁFICO, CAPA E
DIAGRAMAÇÃO**

Sharlene Gonçalves de Araújo



SUMÁRIO

Sobre o Relatório	05
Análise dos dados	07
Etapas em desvio	10
Acompanhamento das metas e prioridades da LDO	13
Acompanhamento das ações de conservação do patrimônio	15
Acompanhamento das obras contratadas pelo GDF	17
Realizações de destaque	20
SAG 2025 - Cronograma - 2º Bimestre	36



SOBRE O RELATÓRIO

A SUPLAN publicou o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro relativo ao 1º Bimestre de 2025 no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 28 de março de 2025, conforme a Portaria nº 225, de 26 de março de 2025.

Tal Relatório contém o acompanhamento da execução física e financeira das ações de Governo previstas no Plano Plurianual-PPA 2024-2027 (ano-base 2024) e desdobrada na Lei Orçamentária Anual - LOA/2024, auxiliando o processo de avaliação da eficiência e eficácia da gestão, a transparência da aplicação dos recursos público, além de permitir o conhecimento do conjunto de ações de governo em seus aspectos quantitativos, qualitativos, espacial e temporal.

O Relatório de Desempenho Físico-Financeiro referente ao 1º bimestre de 2025 (contendo as ações efetivamente executadas nos meses de janeiro e fevereiro extraídas do SAG - Sistema de Acompanhamento Governamental) está disponível no sítio da Secretaria de Estado de Economia - SEEC.

Após a publicação da LOA e detalhamento do crédito orçamentário disponível, os gestores de unidades orçamentárias, responsáveis pela execução e implementação das políticas públicas, definem o que será executado, quando e como será a execução ao longo do exercício, ou seja, quais serão as etapas (entregas) necessárias para a implementação de cada Programa de Trabalho. Os Agentes de Planejamento das Unidades Orçamentárias, bimestralmente, realizam o levantamento, a análise e inserção das informações no Sistema de Acompanhamento Governamental (SAG).

Conforme estabelecido no Manual de cadastramento e acompanhamento de etapas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG, todos os Programas de Trabalho constantes da Lei Orçamentária Anual devam conter, no mínimo, uma etapa cadastrada no SAG no decorrer do exercício, à exceção daqueles inseridos por meio de emenda parlamentar que não apresentaram empenho.

No entanto, no 1º bimestre do exercício, é facultado às Unidades Orçamentárias cadastrar apenas:

- Etapas pertencentes a programas de trabalho com valores empenhados ou contratualizados

- (Estatais) de cunho institucional ou oriundos de emendas parlamentares;
- Etapas procedentes de ano anterior, tratando-se das ações do tipo projeto que no 6º bimestre tenham encerrado o exercício nos estágios “NO – Andamento Normal”, “PA – Paralisada” ou “AT – Atrasada” e, deste modo, ensejam continuidade no presente exercício.

A partir do 2º bimestre, entretanto, é obrigatório que todos os demais programas de trabalho institucionais contidos na Lei Orçamentária Anual, independentemente da ocorrência de empenho, além de emendas parlamentares que tiverem empenho, tenham ao menos uma etapa correspondente cadastrada.

Deste modo, a análise e a compreensão das informações gerenciais apresentadas a seguir deve ser realizada à luz desse contexto.

A seguir, são apresentadas informações gerenciais extraídas do SAG e as realizações em destaque no 1º Bimestre de 2025, enviadas pelas respectivas unidades orçamentárias.




Viaduto do Noroeste. Imagem: Agência Brasília

ANÁLISE DOS DADOS

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DOS DADOS DO SAG 6º BIMESTRE 2024


ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES NO 1º BIMESTRE

No 1º bimestre, a maior parte das etapas cadastradas foram classificadas sob o estágio “Andamento Normal” (75,95%). Em segundo lugar, encontram-se as etapas no estágio “A Ser Iniciada” (18,84%), consistindo no conjunto das etapas cuja data prevista para início de execução não foi alcançada dentro do bimestre em análise. Trata-se de um efeito característico do início de exercício, o qual é atenuado à medida que as execuções são iniciadas.

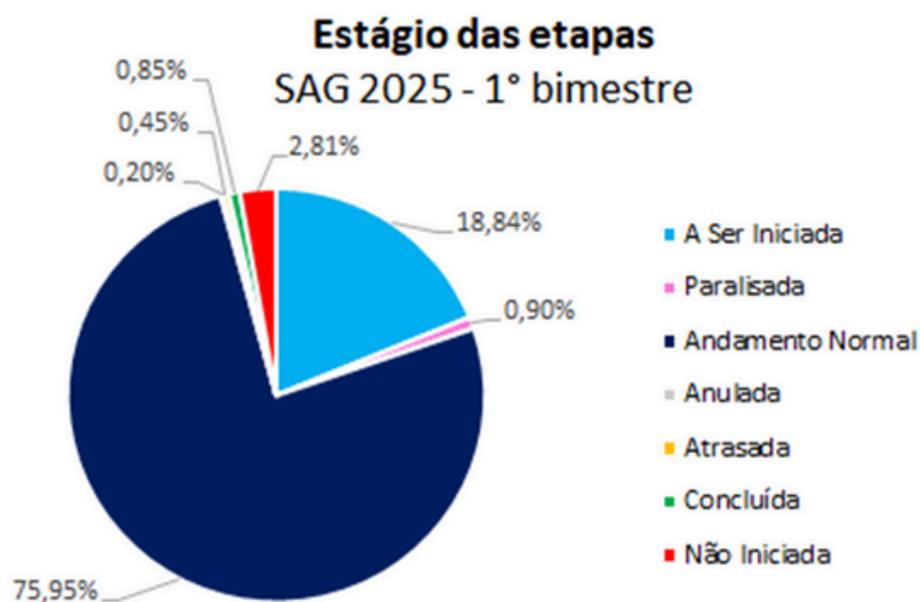


Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

O quadro a seguir evidencia a classificação quanto ao estágio das etapas cadastradas nos programas de trabalho relacionados aos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e às ações de Operações Especiais (que não contribuem para a manutenção, a expansão ou o aperfeiçoamento das ações de governo¹).

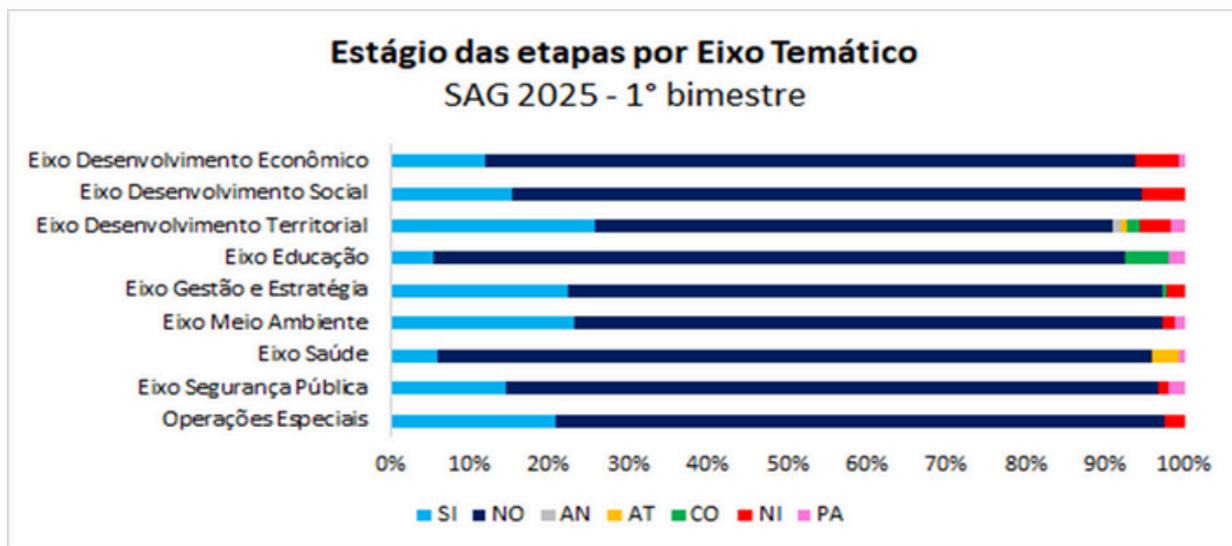

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

Também é possível observar a execução orçamentária dos Programas de Trabalho das etapas cadastradas no SAG. Os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) compreendem as dotações referentes à Administração Direta e Indireta, ao passo que as estatais independentes² possuem parte de seus recursos contidos no Orçamento de Investimentos³ (OI), além de outra parte no denominado Dispêndios das Estatais Independentes. Ressalta-se que os recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) não são acompanhados no SAG, visto que não constam da Lei Orçamentária Anual - LOA.

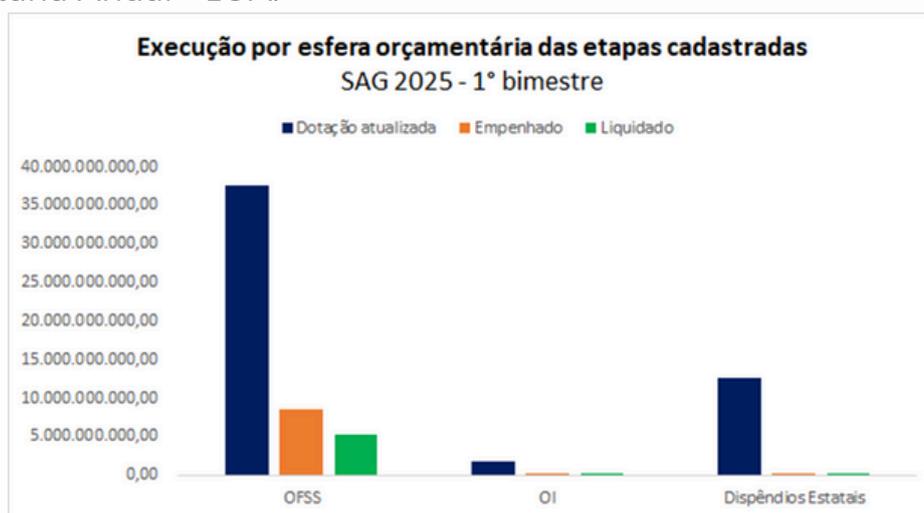

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

¹ Parágrafo 5º do artigo 3º da Lei 7.378/2023


² Estatais independentes não possuem a fase da execução orçamentária do empenho e liquidação, apenas a execução (similar ao estágio liquidação). Portanto, foram considerados como empenho e liquidação os valores de execução no orçamento de investimento e nos dispêndios estatais.

³ Parágrafo 4º do artigo 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal

Ademais, destaca-se que os valores apresentados são aqueles cadastrados no SAG. Assim, os recursos evidenciados são ligeiramente menor que os constantes no controle da execução orçamentária (Relatório de Resumido da Execução Orçamentária - RREQ), ante a obrigatoriedade de cadastramento de etapas no 1º bimestre restrita à ocorrência de empenho, conforme Manual.

Estratificando a execução orçamentária pelos eixos temáticos, é possível notar que, para o Eixo Educação, que possuía R\$ 7,25 bilhões de dotação atualizada, foram liquidados até o final do 1º bimestre mais de R\$ 892,55 milhões. Por sua vez, o Eixo de Desenvolvimento Territorial, com dotação atualizada de R\$ 9,71 bilhões, foram liquidados R\$ 1,06 bilhão para alcançar as metas propostas nas etapas cadastradas no SAG. Ademais, mesmo não sendo eixo temático, as Operações Especiais são aquelas com maiores recursos dotados (R\$ 16,01 bilhões) e liquidados (R\$ 1,40 bilhão).

Segue a execução orçamentária pelos 8 eixos temáticos do Plano Plurianual de 2024-2027 e pelo Programa de Operações Especiais de todas unidades orçamentárias do Distrito Federal até o final do 1º bimestre, considerando os Orçamentos Fiscal e de Seguridade Social, além dos Orçamentos de Investimentos e Dispendios das Estatais Independentes.

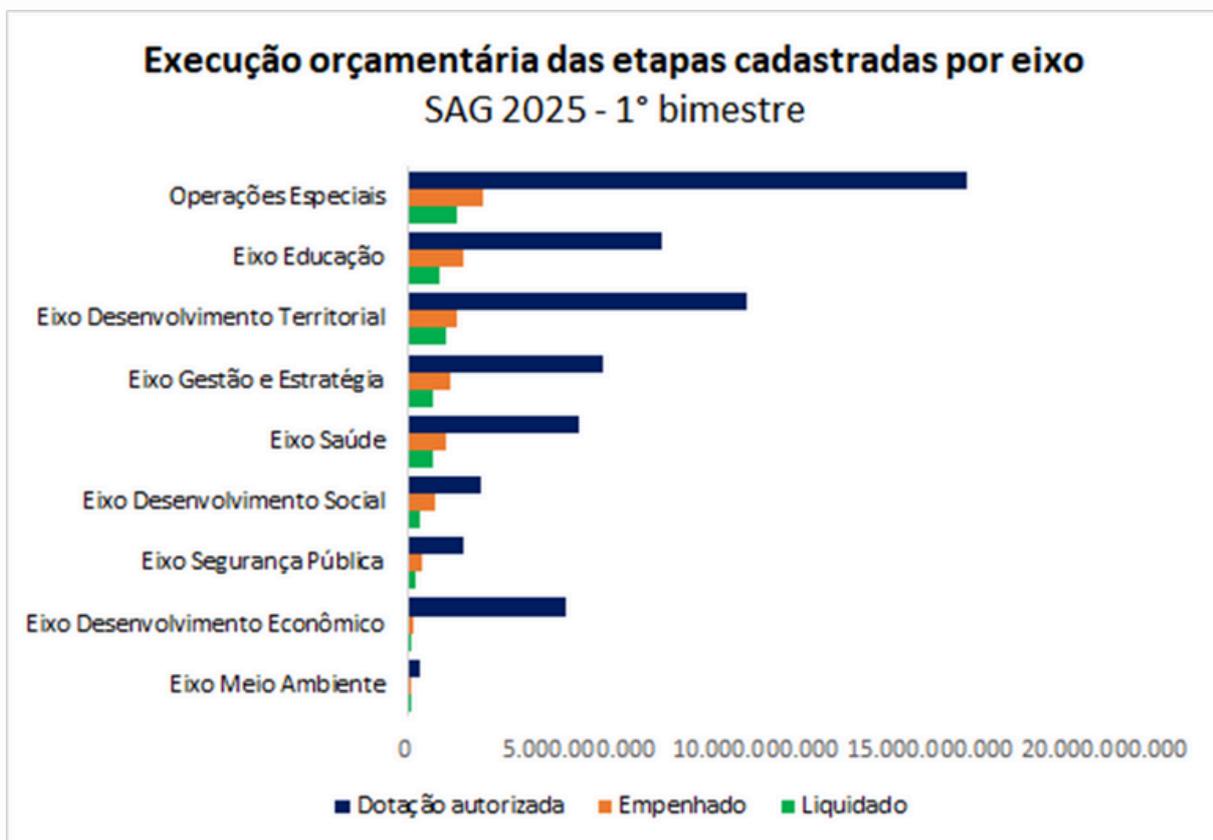


Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

ETAPAS EM DESVIO



A descontinuidade na execução das etapas, caracterizada pela alteração do fluxo regular, enseja o cadastramento de desvio, que consiste em justificativa que envolve informar sua causa, natureza, origem e detalhamento.


São consideradas em desvio as etapas classificadas sob os estágios “Atrasada”, “Paralisada”, “Não Iniciada” e “Anulada”. No 1º bimestre de 2025, 4,36% das etapas se enquadraram nesta classificação, conforme gráfico a seguir.

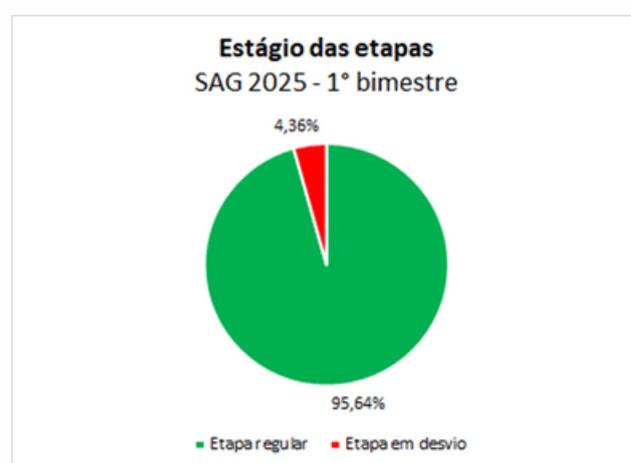

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

Para melhor compreensão dos motivos que ensejaram a classificação de etapas em desvio, serão analisadas a sua natureza e causa.


Quanto à natureza, a principal classificação foi a **Administrativa**, representando 62,07% das etapas em desvio, seguida da **Técnica** (20,69%); **Orçamentária** (10,34%); **Fenômenos Naturais** (3,45%); e **Jurídica** (3,45%). Cabe destacar que nenhuma etapa foi classificada sob as naturezas **Financeira e Política**.

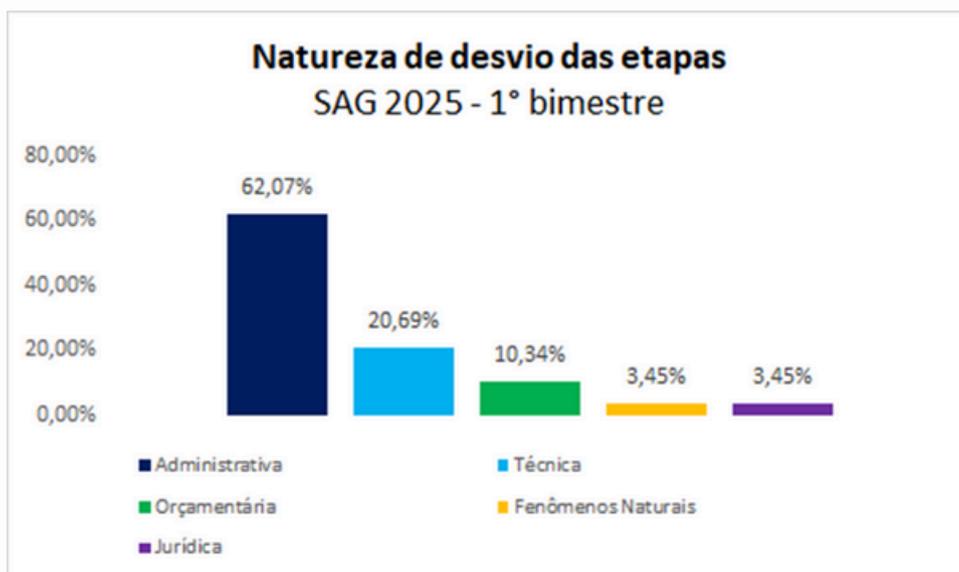

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

De forma complementar, a justificativa da razão do desvio pelas Unidades Orçamentárias também se reporta às causas que levaram aos desvios. No 1º bimestre de 2025, a principal causa consiste em **“OCD – Outras Causas de Desvio”** (54,02%), seguida pelas **“ICO – Insuficiência de Créditos Orçamentários”** (11,49%); **“NOO – Necessidade de ação de Outros Órgãos”** (10,34%); **“IPT – Indefinição ou reavaliação de Projetos Técnicos”** (9,20%); e **“MPA – Morosidade em Procedimentos Administrativos”** (6,90%).

Completam a relação de **Causas** informadas no 1º bimestre/2025: Variações Climáticas (VCL); Insuficiência de Recursos Humanos (IRH); Alteração na Programação da Unidade executiva (APU) e Problemas ou morosidade no Processo Licitatório (PPL).

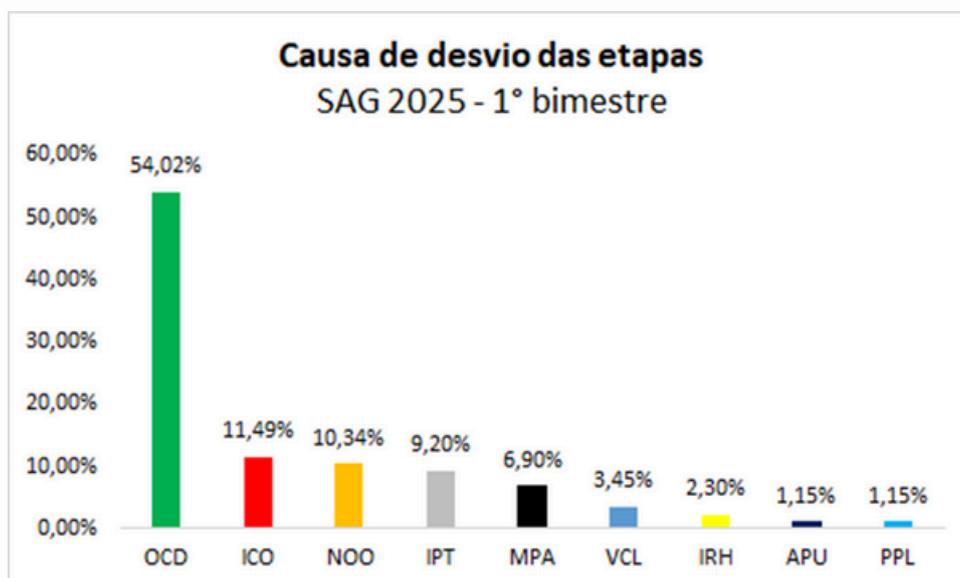

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

Não houve ocorrências das seguintes causas de desvio: Crédito Cancelado (CCA); Crédito Contingenciado ou bloqueado (CCB); Insuficiência de recursos financeiros (IRF); Insuficiência de recursos materiais (IRM); e Pendência de Decisão (PD).




Parquinho infantil e academia comunitária em praça da Comunidade Fercal II. Imagem: Agência Brasília

ACOMPANHAMENTO DAS METAS E PRIORIDADES DA LDO

Foram definidos 50 Programas de Trabalho, devido ao seu impacto, como metas e prioridades da administração distrital para o exercício de 2025, conforme Anexo I da LDO⁶, os quais foram desmembrados em 75 etapas cadastradas no SAG.

No 1º bimestre, cerca de 73% das etapas estavam sob “Andamento Normal” e 4% das etapas cadastradas estavam classificadas no estágio “Concluída”. Já 18,67% estavam em desvio em relação ao programado, sendo etapas anuladas (1,33%); paralisadas (10,67%); ou atrasadas (6,67%).

**Estágio das etapas do Anexo I - Metas e Prioridades
LDO 2025
SAG 2025 - 1º bimestre**

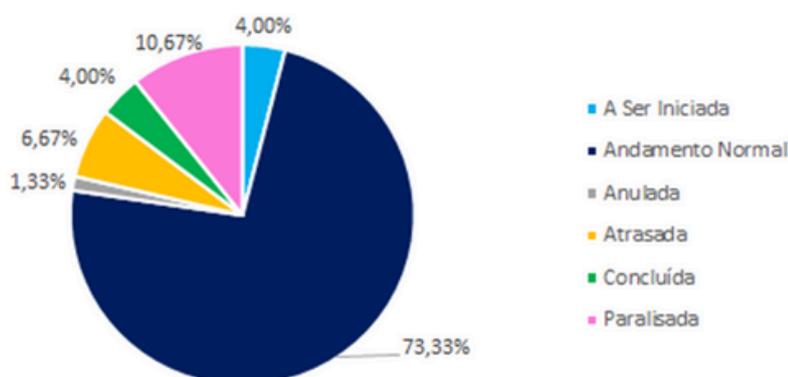

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo I da Lei 7.549/2024 – PPA 2024 -2027

Até o final do 1º bimestre, foram empenhados mais de R\$ 1,15 bilhão e liquidados mais de R\$ 638 milhões nestes programas de trabalho definidos como prioritários pelo poder público distrital.



Túnel Rei Pelé. Imagem: Agência Brasília

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO


Conforme apresentado na seção 3 Manual, o Orçamento Público Distrital apresenta de forma segregada os dispêndios com a Conservação do Patrimônio Público Imobiliário.

A partir do rol de 14 ações orçamentárias estabelecidas, é possível estratificar os dados

do SAG quanto ao acompanhamento destas ações para a conservação do patrimônio público distrital.

No 1º bimestre, estavam cadastradas 118 etapas referentes a 108 Programas de Trabalho relacionados à Conservação do Patrimônio Público. Destas, 66,95% encontram-se em “Andamento Normal” ao final do bimestre, 26,27% como “A Ser Iniciada” e 6,78% definidas em ‘Não Iniciada’.

Estágio das etapas de Conservação do Patrimônio SAG 2025 - 1º bimestre

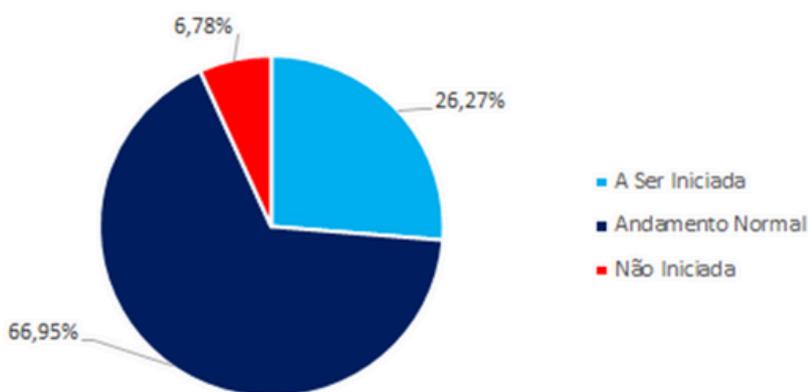

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025

⁶ Anexo de Metas e Prioridades da LDO, publicado no Anexo I da Lei 7.549/2024 – PPA 2024 -2027

Até o final do 1º bimestre, foram empenhados mais de R\$ 410 milhões e liquidados mais de R\$ 269 milhões nos programas de trabalhos para Conservação do Patrimônio Público Imobiliário do Distrito Federal.




Centro de Educação da Primeira Infância do Riacho Fundo. Imagem: Agência Brasília

ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS CONTRATADAS PELO GDF

No 1º bimestre, foram cadastradas no SAG 289 etapas relacionadas a Obras. Quanto ao estágio, 65,40% se encontram sob “Andamento Normal”; 17,30% foram enquadradas como “A Ser Iniciada”; 6,23% estão “Paralisadas”; e 5,19% foram “Concluídas”. Os demais estágios representaram menos de 3% do total.


Das 289 etapas, 233 foram localizadas em mais de uma Região Administrativa (RA). Das 56 restantes, 1 etapa por RA, as que mais tiveram obras cadastradas no SAG foram as regiões do Plano Piloto (RA I) e Sobradinho II (RA XXVI), com 10 obras, seguida de Planaltina (RA VI), com 6.

**Estágio das etapas de obras
SAG 2025 - 1º bimestre**

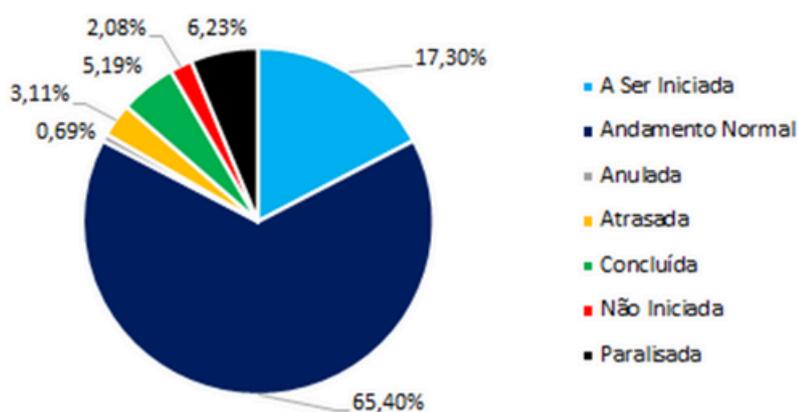

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025


Para facilitar a compreensão, segue mapa da distribuição geográfica das Regiões Administrativas, bem como de suas respectivas etapas.

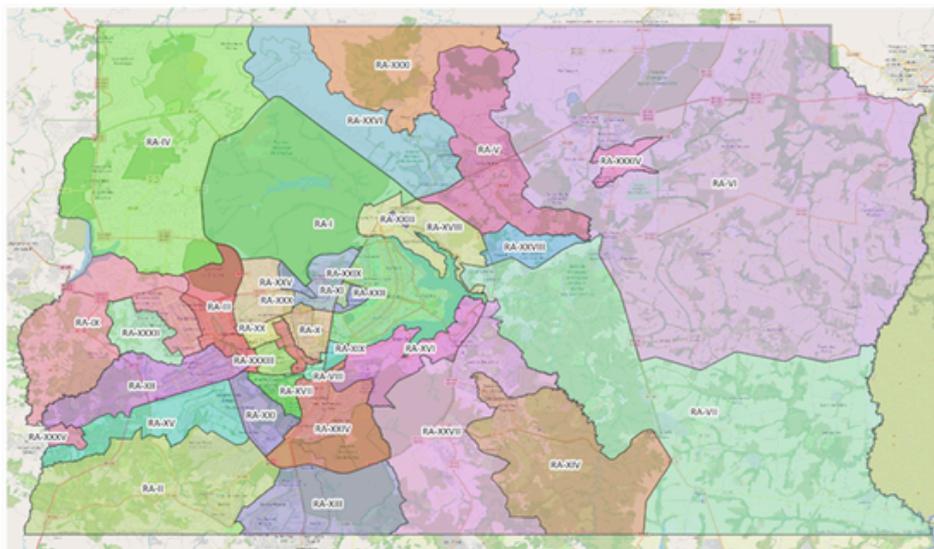

REGIÕES ADMINISTRATIVAS			
RA I - PLANO PILOTO	RA X - GUARÁ	RA XX - ÁGUAS CLARAS	RA XXX - VICENTE PIRES
RA II - GAMA	RA XI - CRUZEIRO	RA XXI - RIACHO FUNDO	RA XXXI - FERCAL
RA III - TAGUATINGA	RA XII - SAMAMBAIA	RA XXII - SUDOESTE/OCTOGONAL	RA XXXII - SOL NASCENTE/PÔR DO SOL
RA IV - BRAZLÂNDIA	RA XIII - SANTA MARIA	RA XXIII - VARJÃO	RA XXXIII - ARNIQUEIRA
RA IX - CEILÂNDIA	RA XIV - SÃO SEBASTIÃO	RA XXIV - PARK WAY	RA XXXIV - ARAPOANGA
RA V - SOBRADINHO	RA XV - CANDANGOLÂNDIA	RA XXIX - SIA	RA XXXV - ÁGUA QUENTE
RA VI - PLANALTINA	RA XVI - RECANTO DAS EMAS	RA XXV - SCIA	
RA VII - PARANÓÁ	RA XVII - LAGO SUL	RA XXVI - SOBRADINHO II	
RA VIII - NÚCLEO BANDEIRANTE	RA XVIII - LAGO NORTE	RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO	
		RA XXVIII - ITAPOÃ	

Fonte: SEEC/SEFIN/SUPLAN.

Etapas de Obras por Região Administrativa SAG 2025 - 1º bimestre

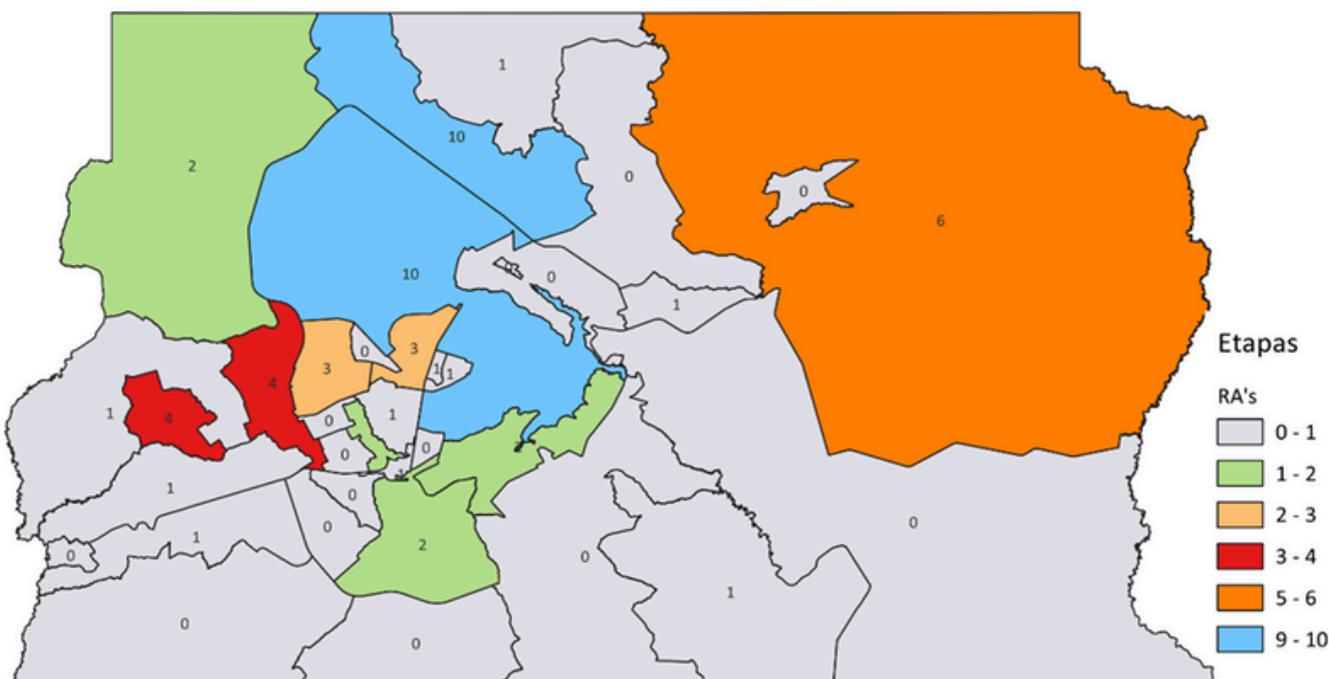

Fonte: Elaboração a partir dos dados extraídos do Discoverer 28/02/2025.

A seguir constam os tipos de obras de cada etapa cadastrada, conforme classificação constante no Manual (Tabela 1 – Código de Obras).

TIPO DE OBRAS	QUANTIDADE
Obras no sistema de Saneamento	34
Obras de energia elétrica e iluminação pública	11
Obras de urbanização	42
Obras e edificações públicas	31
Obras para fins desportivos e de lazer	14
Obras para fins culturais	2
Obras para fins de educação	60
Obras para fins de saúde	7
Obras para fins de segurança	6
Obras para fins de assistência social	4
Obras de transporte	37
Obras para fins de segurança de trânsito	1
Obras para fins habitacionais	5
Obras para fins de preservação do meio ambiente	2
Obras para fins de agricultura	0
Obras para fins de desenvolvimento econômico	3
Serviços de Engenharia	30
TOTAL	289

As principais unidades orçamentárias que cadastraram etapas relativas a obras no 1º bimestre estão discriminadas a seguir:

- 1) Secretaria de Educação: 54 etapas;
- 2) Caesb: 36 etapas;
- 3) Novacap: 29 etapas;
- 4) Secretaria de Obras: 26 etapas; e
- 5) DER: 22 etapas.

REALIZAÇÕES DE DESTAQUE

Dentre as etapas cadastradas no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAC no 1º Bimestre de 2025, destacam-se:



Obra em andamento na EPIC. Imagem: Agência Brasília



UnDF

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

18.203

UNDF ABRE 42 VAGAS PARA PÓS-GRADUAÇÃO EM METODOLOGIAS ATIVAS

A Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes (UnDF) abriu seleção para 42 vagas na Especialização em Práticas Interdisciplinares e Metodologias Ativas na Educação Básica. O curso, primeiro lato sensu da instituição, será oferecido no 1º semestre de 2025 no Campus Norte.

As inscrições, gratuitas, ocorreram de 23/01 a 23/02 no site da UnDF. O processo seletivo foi realizado considerando três modalidades de acesso: reserva de 22 vagas para professores da rede pública de ensino do Distrito Federal (ensino médio ou anos finais do ensino fundamental); reserva de 10 vagas para profissionais da educação graduados em licenciatura com deficiência ou que se declaram negras (pretas e pardas), indígenas e quilombolas; e destinação de 10 vagas para ampla concorrência para pessoas com graduação em licenciatura.

Com 392 horas, as aulas presenciais e online acontecem às segundas e quintas-feiras à tarde, com início em 24/03.



Fachada externa do Campus Norte



Parte interna do Campus Norte



UnDF

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

18.203

UNDF OFERECE CURSO DE VERÃO EM 2025 AOS ESTUDANTES

O Curso de Verão 2025 é uma oportunidade para a oferta de diversas unidades curriculares dos cursos de graduação em funcionamento. O curso foi realizado no período de 20/01 a 07/02, com as seguintes disciplinas:

Unidade Curricular	Carga horária	Curso
Metodologias Problemáticas I	20h	Núcleo Universal
Culturas Digitais	40h	Núcleo Universal
Comunicação e Meio Ambiente	40h	Gestão Ambiental
Estética e História da Arte	60h	Produção Cultural
Prática de Leitura e Escrita	60h	Produção Cultural
Fundamentos da Produção Cultural	60h	Produção Cultural
Gestão nos Espaços Formativos	80h	Pedagogia
História da Educação	60h	Pedagogia
Política Pública em Educação	60h	Pedagogia

UNDF ADQUIRE QUATRO MODELOS DE SIMULADORES DE ALTA FIDELIDADE PARA O LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA DA ESCS

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), integrada à UnDF, terá um novo Laboratório de Simulação Realística. O contrato de R\$ 1,5 milhão foi assinado em 29 de janeiro, garantindo a aquisição de quatro simuladores de alta fidelidade (adulto, gestante, criança e bebê), com entrega prevista em 120 dias. A reforma do espaço foi realizada pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs), e os recursos são do Fundo da UnDF.





UnDF

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

18.203

UNDF ADQUIRE QUATRO MODELOS DE SIMULADORES DE ALTA FIDELIDADE PARA O LABORATÓRIO DE SIMULAÇÃO REALÍSTICA DA ESCS

A iniciativa, parte do processo de integração da ESCS à UnDF, moderniza a formação em saúde, proporcionando um ambiente de aprendizado avançado. Os simuladores permitem treinos realistas, elevando a qualificação profissional e a segurança dos atendimentos. O laboratório contará com cinco ambientes: duas salas de debriefing, uma sala de comando e duas salas de procedimentos.

O local já possui equipamentos hospitalares, computadores e mobiliários e será gerido por uma Comissão Estruturante da Fepecs, responsável elaboração de ações de planejamento para a estruturação administrativa e pedagógica do espaço.

ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE OFERTA 160 VAGAS PELO SISU 2025

A Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência da Saúde (Fepecs) e vinculada à UnDF, ofereceu 160 vagas em 2025 para os cursos de medicina e enfermagem, com ingresso exclusivo pelo Sistema de Seleção Unificada - SiSu, entre 17 e 21 de janeiro. Serão 80 vagas por curso, distribuídas entre sistema universal (48 vagas por curso) e cotas (32 vagas por curso), que reserva 40% das vagas para quem cursou todas as séries do ensino fundamental e médio em escolas públicas no DF ou em outras unidades da federação, conforme Lei Distrital nº 3.361/2004 e Decreto nº 25.394/2004.

Os candidatos devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio 2024 - Enem e se inscrever no SiSu. As vagas podem ser consultadas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado está previsto para 26 de janeiro, e as chamadas para matrícula serão divulgadas nos sites da UnDF e Escs.



UnDF

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL
PROFESSOR JORGE AMAURY MAIA NUNES

18.203

REGULAMENTAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL FORTALECE CONSOLIDAÇÃO DA UNDF

O Governo do Distrito Federal avança na consolidação da Universidade do Distrito Federal (UnDF) com a publicação do Decreto nº 46.872/2025, que regulamenta a escolha do Reitor e Vice-Reitor, garantindo transparência e gestão democrática. A reitora pro tempore, Simone Benck, destaca a importância histórica do processo, previsto na Lei Complementar nº 987/2021, para fortalecer a governança da instituição.

O processo eleitoral será conduzido pela Comissão Especial Eleitoral (CEE) e envolverá docentes, estudantes e técnicos-administrativos. Desde 2021, a UnDF tem expandido sua infraestrutura, cursos e assistência estudantil, consolidando-se como referência no ensino superior público do DF. Em 2024, lançou cinco novos cursos, ampliou vagas e fortaleceu sua pesquisa e extensão.

Com a regulamentação do processo eleitoral, a UnDF entra em uma nova fase de crescimento e impacto na educação superior, assegurando continuidade e estabilidade institucional.



Fachada externa do Campus Norte



Reitora pro tempore Simone Benck



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

20.201

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO RECANTO DAS EMAS

Execução das obras de implantação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas.

Obra iniciada em 01/01/2023 com previsão de término em 31/12/2025

- Principais serviços executados acumulado:
- 1.539,01 m de rede de drenagem pluvial;
- 15.763 m² de pavimento asfáltico; e
- 79 postes de energia implantados.





IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DRENAR/DF

Executar obras de infraestrutura de drenagem pluvial dentro do Programa Águas do DF Implantação de infraestrutura de drenagem pluvial complementar, com galerias de reforço, em método construtivo não destrutivo, com as interligações necessárias do sistema existente e ao sistema existente e as estruturas projetadas para isso, trecho de rede em manilhas de concreto convencionais, implantação de novas bocas de lobo para captação das águas pluviais com os respectivos ramais de ligação e bacia de retenção de qualidade a céu aberto, com estruturas de entrada, saída, cercamento, tratamento das encostas e rampa de acesso, dentro do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte – Asa Norte/Plano Piloto –DF.

Obra iniciada em 01/01/2024, com previsão de término em 31/12/2025. Principais serviços executados acumulado:

- 7.575,56 m de tunnel liner;
- 32.464,20 m³ de escavação do tunnel liner;
- 46.069,99 m² de revestimento em concreto;
- 10.615,85 m² de bacia de retenção com dispositivos de entrada e de saída e plantio;
- 10.295,05 m³ de escavação mecânica; e
- 5 poços de visita.

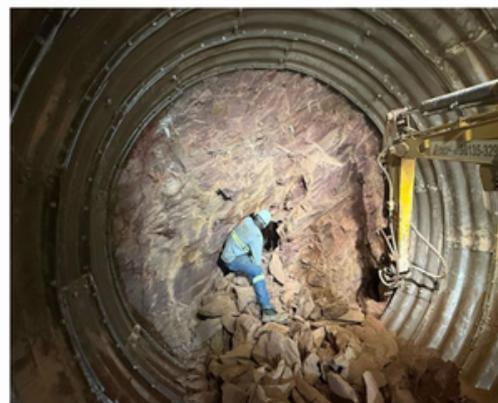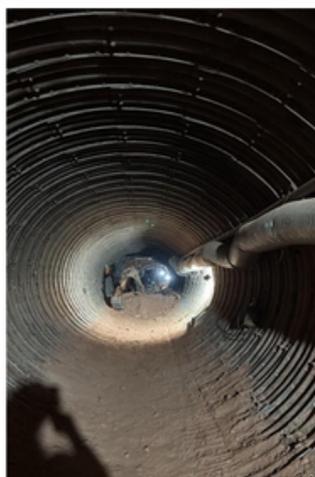



COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA

20.201

EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS

Construção de quadras poliesportivas e cercamento com muro das Quadras 2 e 4 do Residencial Aldeias do Cerrado.



SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SODF

22.101

DUPLICAÇÃO, COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 1,2 KM, DA VIA DE LIGAÇÃO GUARÁ - NÚCLEO BANDEIRANTE, NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO GUARÁ - RA-X E NO PARK WAY - RA XXIV - CONTRATO Nº. 023/2023: ETAPA 0007

A duplicação da Via de Ligação, com extensão aproximada de 1,2 km, entre a Avenida Contorno do Guará II e a interseção com a Rodovia DF-079, intitulada Via de Ligação Guará - Núcleo Bandeirante, localizada nas Regiões Administrativas do Guará - RA X e Park Way - RA XXIV, representa a promoção de segurança viária aos usuários, assim como, maior conforto e fluidez ao tráfego local.

- % executado até o 1º bimestre/2025: 64,70%.
- Principais serviços executados no 1º bimestre:
 - Execução de rede de drenagem pluvial: 93m;
 - Assentamento de meios fios: 678m;
 - Execução de calçadas: 1.571m²; e
 - Plantio de grama: 8.840m².



Execução de plantio de grama.



Execução de calçadas.



Execução de rede de drenagem.



Execução de assentamento de meios fios.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SODF

22.101

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE READEQUAÇÃO DA RODOVIA DF-011, DENOMINADA ESTRADA PARQUE INDÚSTRIAS GRÁFICAS – EPIG- CONTRATO: Nº 021/2022: ETAPA 0024

A intervenção consiste da elaboração de estudos técnicos, elaboração de projetos básicos e executivos, execução das obras de readequação e elaboração do Manual de Operação, Uso e Manutenção da Rodovia DF-011, denominada EPIG, incluindo implantação de faixa exclusiva para ônibus no sistema BRT ("Bus Rapid Transit"), viadutos, estações BRT, passagens para pedestres, infraestrutura e demais serviços e operações necessárias e suficientes para a entrega final do objeto.

- % executado até o 1º bimestre/2025: 46,15%.
- Principais serviços executados no 1º bimestre:
 - Trecho 1 - Viaduto OAE 01: 2,88%;
 - Trecho 2 - Terraplenagem: 30,30% e Pavimento flexível: 6,88%;
 - Trecho 4 - Terraplenagem: 23,94%; e
 - Trecho 6 - Terraplenagem: 5,20% e Drenagem pluvial: 3,12%.



Execução de viaduto - OAE 01.



Execução de rede de drenagem.



Execução de terraplenagem.



Execução de pavimento flexível.

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO DISTRITO FEDERAL

SODF

22.101

REFORMULAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NA ESTRADA DO SETOR POLICIAL MILITAR – ESPM, NO TRECHO ENTRE A INTERSEÇÃO EPIG/ESPM E O VIADUTO W3 SUL, PARA IMPLANTAÇÃO DE CORREDOR EXCLUSIVO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO NO SISTEMA BRT (BUS RAPID TRANSIT), DENOMINADO CORREDOR EIXO OESTE - CONTRATO Nº. 022/2021:


ETAPA 0022

A intervenção ao longo da ESPM contempla pavimentação, drenagem, sinalização, paisagismo, calçadas, ciclovias e execução de Bacia de Detenção a ser localizada na área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Santuário de Vida Silvestre Riacho Fundo Área III, às margens da DF-051, Estrada Parque das Nações - Via L4.

- % executado até o 1º bimestre/2025: 98%.
- Principais serviços executados no 1º bimestre:
- Tracionamento de escudo metálico: 5,90m²; e
- Plantio de grama: 14.307m².



Escudo metálico.

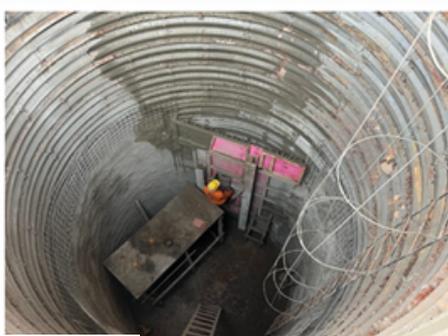

Escudo metálico.



Execução de plantio de grama.



Execução de terraplenagem.

FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FS-DF

23.901

REVITALIZADA, COZINHA DO HRT PRODUZ ATÉ 2,4 MIL REFEIÇÕES POR DIA

Com uma produção que chega a 2,4 mil refeições por dia, a cozinha do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) oferece mais segurança alimentar e melhores condições de trabalho aos 110 trabalhadores que atuam desde a conservação dos alimentos até a distribuição a pacientes, acompanhantes e servidores.

A obra completa contou com a troca de pisos, paredes e bancadas. Houve ainda adequações hidráulicas, elétricas e no fornecimento de gás. O refeitório dos servidores também recebeu melhorias, ofertando mais qualidade no ambiente de trabalho.

A conclusão dos serviços no HRT marca o avanço na modernização das cozinhas de todos os hospitais da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF). As unidades de Samambaia, Ceilândia, Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Paranoá e Guará já haviam recebido as melhorias nos últimos dois anos. Os próximos serão o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e Hospital Materno-Infantil de Brasília (Hmib), ambos com previsão de início dos serviços ainda no primeiro semestre de 2025.



FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FS-DF

23.901

HRC RECEBE EQUIPAMENTOS CIRÚRGICOS QUE SOMAM R\$ 2,5 MILHÕES

O projeto de renovação e ampliação do parque tecnológico do Hospital Regional de Ceilândia (HRC) continua em expansão. A unidade passa a contar neste início de ano com dois novos arcos cirúrgicos. Os equipamentos – que somam R\$ 2,5 milhões e foram adquiridos por meio de processo licitatório regular – fornecem exames de imagem em tempo real e em alta resolução, permitindo intervenções mais precisas e céleres, além de aumentar a segurança de profissionais e pacientes. A unidade hospitalar da Região de Saúde Oeste (Ceilândia, Brazlândia e Pôr do Sol/Sol Nascente) já conta com dois aparelhos semelhantes em funcionamento. O conjunto contribui para a realização, em média, de dez procedimentos por dia de diferentes especialidades. As novas aquisições permitirão a expansão dos atendimentos em 50%, além de garantir uma estrutura sobressalente, caso necessário.

No último mês a unidade investiu R\$ 335,8 mil em aquisição de equipamentos e instrumentais. Além de material técnico, o recurso serviu para a compra de quase 350 novas cadeiras para uso de pacientes, servidores e acompanhantes.



FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - FS-DF

23.901

HOSPITAL DO GUARÁ GANHA ÁREA MAIS MODERNA PARA PACIENTES GRAVES

A Sala Vermelha do Hospital Regional do Guar4 (HRGu) est4 mais moderna, funcional e adaptada 4s necessidades de atendimento m4dico de urg4ncia e emerg4ncia. A revitaliza4o do espa4o - destinado aos pacientes com quadro cl4nico grave, que precisam de cuidados m4dicos intensivos - contou com um investimento de R\$ 113 mil.

Com a revitaliza4o da Sala Vermelha, o Hospital Regional do Guar4 d4 um passo importante para oferecer um atendimento ainda mais eficiente e humanizado aos pacientes em estado grave. O investimento n4o s4o modernizou as instala4oes, mas tamb4m contribuiu para a melhoria da seguran4a e do conforto tanto para os pacientes quanto para os profissionais de sa4de. Uma das mudan4as realizadas foi a adapta4o do banheiro, para que ele seja adequado aos pacientes com necessidades especiais (PNE).

O piso e o mobili4rio foram trocados e os sistemas de gases - individuais para cada leito - foram instalados, atendendo 4s necessidades espec4ficas de oxig4nio para os pacientes.

As paredes foram tratadas com materiais que proporcionam isolamento ac4stico, os vidros receberam pel4cula para maior privacidade e controle de luz e as janelas foram restauradas para garantir mais seguran4a e durabilidade. De acordo com a diretoria do HRGu, esse processo 4 fruto de um trabalho em equipe: "A revitaliza4o elevou a qualidade e a seguran4a no cuidado prestado aos pacientes e ao mesmo tempo criou um ambiente de trabalho mais adequado para os servidores. Esse resultado 4 fruto do empenho de toda a equipe do hospital e do apoio fundamental da Superintend4ncia e da Secretaria de Sa4de".



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL

DER-DF

26.205

IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RODOVIAS VICINAIS VC-383/379 NA ÁREA RURAL PONTE ALTA DE BAIXO – GAMA

A obra de pavimentação das Rodovias VC-383 e VC-379 – que gerou cerca de 70 empregos e hoje beneficia mais de 10 mil pessoas, entre moradores, produtores rurais e motoristas – foi inaugurada em 10/02/2025 pelo Governo do Distrito Federal (GDF), atendendo a uma demanda de mais de 20 anos da comunidade local.

Executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), a pavimentação perpassa um trecho de 7,5 km das rodovias vicinais VC-383 e VC-379, que também foram alargadas, aumentando o nível de segurança e conforto dos condutores. O trabalho consistiu na extensão e na concretagem da via, que agora tem duas faixas de 11 metros e dois acostamentos de 2,5 metros cada, sendo um de cada lado da via.



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL


DER-DF

26.205

RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA DISTRITAL DF-180 (TRECHO BR-080 A BR-070)

Importante corredor viário que conecta os entroncamentos da BR-070 e da BR-080, o trecho da DF-180 em Brazlândia foi totalmente recuperado com a conclusão das obras de restauração asfáltica, entregues em 14/02/2025. Para modernizar os 7,6 quilômetros da região conhecida como Garrafão, no Incra 8, o Governo do Distrito Federal (GDF) investiu R\$ 11 milhões, proporcionando mais conforto e segurança aos 30 mil motoristas que trafegam pela via diariamente.

A recuperação, executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) com recursos da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), gerou aproximadamente 80 empregos e beneficia cerca de 30 mil motoristas que trafegam diariamente pelo trecho.

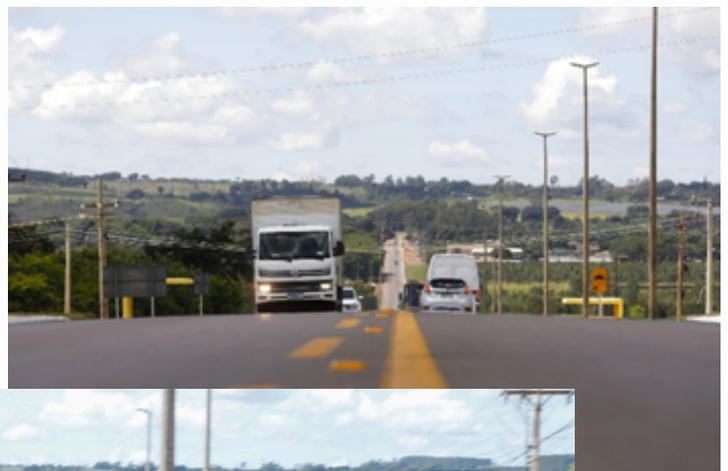

SAG 2025 CRONOGRAMA 2º BIMESTRE

Para dar suporte técnico e operacional as atividades de prestação de informações pelas Unidades Orçamentárias, foi realizada Reunião Técnica nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2025, a fim de repassar instruções acerca da elaboração do Relatório no módulo de Acompanhamento da Execução Físico-Financeira Governamental – SAG. No site da SEEC estão disponíveis o [Manual de orientações](#) e a [arquivo da Apresentação](#) da Abertura do SAG 2025.

O SAG WEB - Sistema de Acompanhamento Governamental será aberto no dia 10 de abril de 2025 e permanecerá disponível até o dia 15 de maio de 2025, para a realização das atualizações pelas Unidades Orçamentárias referente ao 2º bimestre. Após análise de conformidade pela equipe técnica da SUPLAN, será publicado o Relatório de Desempenho Físico-Financeiro do 2º Bimestre, até o dia 30 de maio de 2025.
